



TEMA 1. UNA VISIÓN GENERAL DE LA GESTIÓN DE PROYECTOS

Índice

1. ¿Qué es un proyecto?

1.1. Relación entre Portafolios, Programas y Proyectos

1.2. ¿Por qué fracasan los proyectos?

1.3. Claves de éxito en el desarrollo de un proyecto

2. ¿Qué es la dirección de proyectos?

2.1. Dirección de proyectos

2.2. Áreas de gestión de proyectos

2.3. Procesos de gestión de proyectos

3. Estándares de Dirección de Proyectos

1. ¿QUÉ ES UN PROYECTO?

Un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único.

An hourglass with red beads falling from the top bulb to the bottom bulb, set against a yellow background.


Temporales

A row of several oranges with a single green apple in front of them, all on a white background.

Resultados únicos

A yellow sunflower in a green field being watered by a black watering can, with water spraying over the flower against a blue sky.

**Se elaboran
gradualmente**




1. ¿QUÉ ES UN PROYECTO?

Un proyecto se caracteriza por...


- Ser temporal: tiene comienzo y final definido.
- Finalizar cuando:
 - Se logran objetivos.
 - Los objetivos no se pueden alcanzar.
 - La necesidad ya no existe.
- Generar un Producto, Servicio o Resultado Único.
- Tener elaboración progresiva: paso a paso.


1.1. RELACIÓN ENTRE PORTAFOLIOS, PROGRAMAS Y PROYECTOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA ORGANIZACIÓN

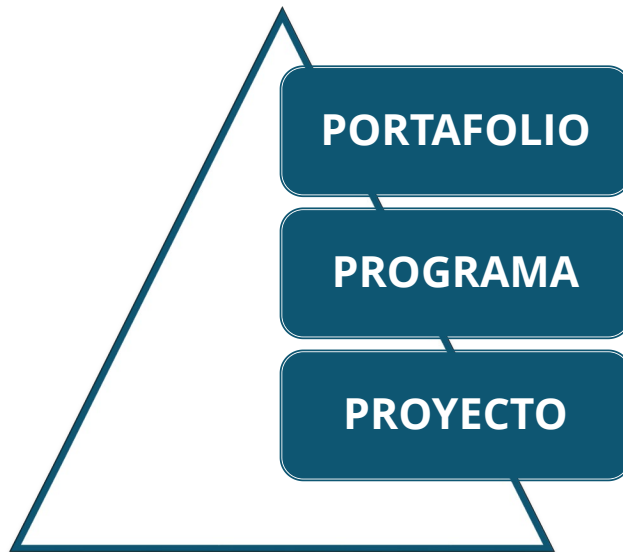

1.1. RELACIÓN ENTRE PORTAFOLIOS, PROGRAMAS Y PROYECTOS

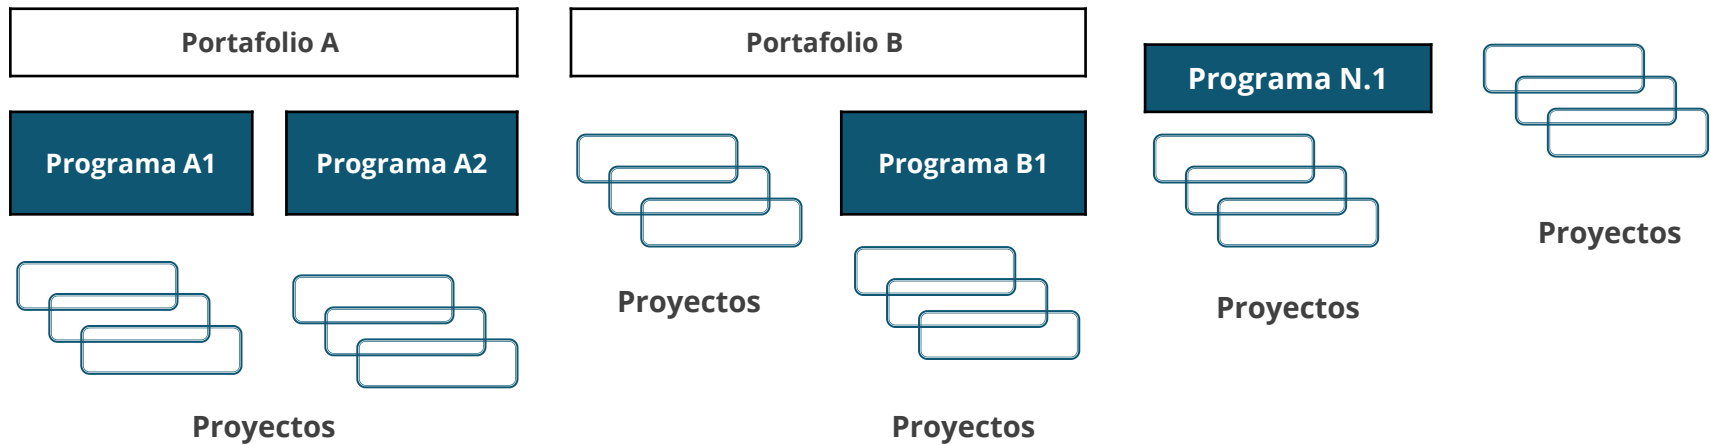




1.1. RELACIÓN ENTRE PORTAFOLIOS, PROGRAMAS Y PROYECTOS

¿Qué es un portafolios?


- Un portafolio es un conjunto de programas, proyectos, u otros trabajos, que se agrupan para facilitar la gestión efectiva, a fin de cumplir con los objetivos estratégicos del negocio.
- Los programas o proyectos de un portafolio no necesariamente son interdependientes o están directamente relacionados.
- La financiación y el soporte se puede hacer en base a categorías riesgo/recompensa, líneas de negocios, o tipos de proyectos.



1.1. RELACIÓN ENTRE PORTAFOLIOS, PROGRAMAS Y PROYECTOS

¿Qué es un programa?

- Un programa es un grupo de proyectos relacionados que se manejan coordinadamente para obtener beneficios y control, que no se podrían obtener si se manejaran individualmente.
- Los programas también implican una serie de tareas repetitivas o cíclicas, ejemplo: programa de construcción, programa de recaudación de fondos, etc.
- En contraste con la gestión de proyectos, la gestión de programas es la gestión centralizada y coordinada de un grupo de proyectos para lograr los objetivos y beneficios estratégicos del programa.



1.1. RELACIÓN ENTRE PORTAFOLIOS, PROGRAMAS Y PROYECTOS

¿Qué es un subproyecto?

- Los proyectos frecuentemente se dividen en componentes más manejables o subproyectos.
- Estos subproyectos pueden ser referidos y considerados como proyectos y ser manejados como tales.
- Ejemplos de subproyectos pueden ser:
 - Basados en procesos o fases del proyecto, de acuerdo a requisitos de habilidades de recursos humanos, que involucren tecnología especializada.
- En proyectos muy grandes los subproyectos pueden a su vez consistir de una serie de subproyectos aún más pequeños.

1.1. RELACIÓN ENTRE PORTAFOLIOS, PROGRAMAS Y PROYECTOS

Proyectos VS Operaciones

Redactar un trabajo final ↔ Tomar notas en clase

Desarrollar un sistema de información
para una cadena de suministro

Responder a una petición en una
cadena de suministro


Registrar cada día los recibos de
ventas en el libro de contabilidad

Escribir una nueva pieza de piano

Practicar escalas en el piano

Diseñar un iPod que sea de 2×4
pulgadas más o menos, que tenga una
interfase con una PC y que almacene
10.000 canciones

Fabricar de manera rutinaria un
iPod de Apple




1.2. ¿POR QUÉ FRACASAN LOS PROYECTOS?

Los principales motivos que originan fracasos en el cumplimiento de los proyectos:

- 21% Cambios en los objetivos definidos a nivel estratégico.
- 31% No utilización, o mala utilización, de metodologías de trabajo
- 48% Problemas humanos, de dirección, comunicación y conflictos entre el personal

Sólo el 20% de los proyectos finalizan obteniendo el objetivo planteado, en el tiempo y con los recursos estimados.




1.2. ¿POR QUÉ FRACASAN LOS PROYECTOS?

1. No se emplearon métricas para el proyecto
2. Mala planificación
3. Mala definición del alcance
4. No se realizaron revisiones periódicas del progreso
5. No se utilizaron herramientas o metodologías adecuadas
6. No se cuenta con el apoyo de alta gerencia
7. No se recurrió al manejo de riesgos
8. El director no era el mejor
9. El equipo no era el mejor
10. Pruebas inadecuadas e informales

1.3. CLAVES DE ÉXITO EN EL DESARROLLO DE UN PROYECTO

Un proyecto exitoso es aquel que....

1. Establece el Objetivo SMART

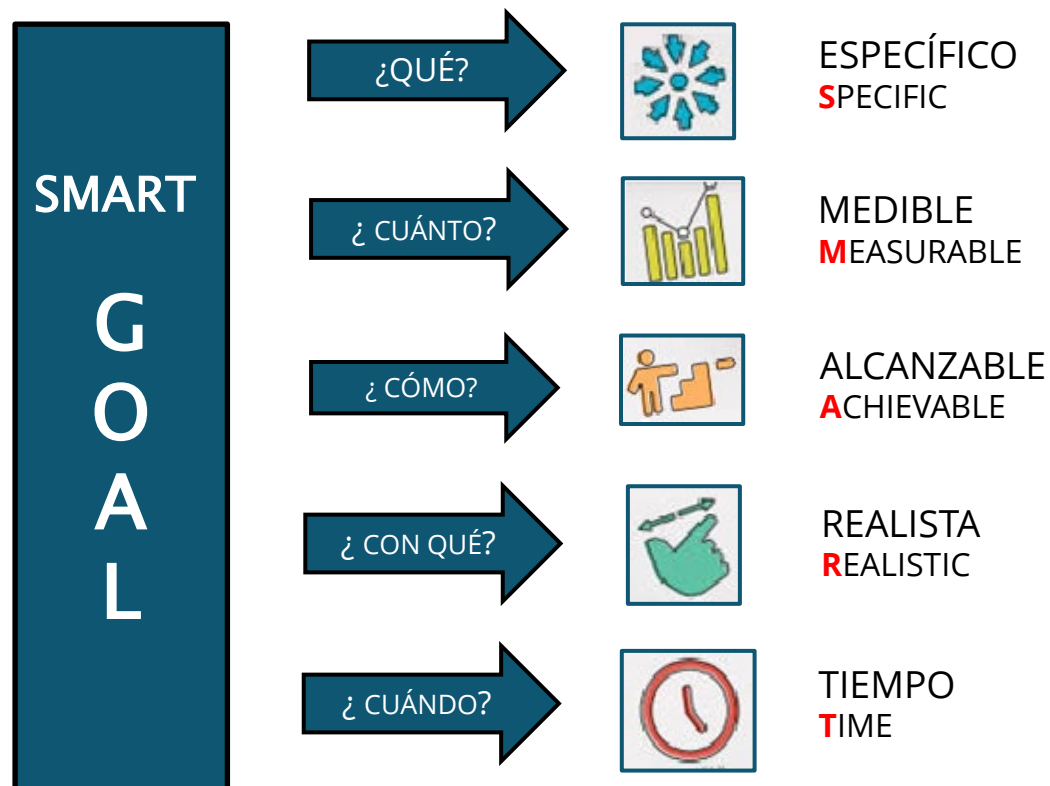


1.3. CLAVES DE ÉXITO EN EL DESARROLLO DE UN PROYECTO

Un proyecto exitoso es aquel que....

2. Establece el alcance de producto

Acordar el alcance del producto con el cliente y los promotores del proyecto. Muchas veces a lo largo del proyecto se nos pide que incluyamos algo que no estaba en el alcance e irremediablemente afecta a los otros factores que componen la triple restricción en los proyectos Alcance-Tiempo-Costo.

Es importante describir adecuadamente el producto que entregaremos al cliente al final del proyecto

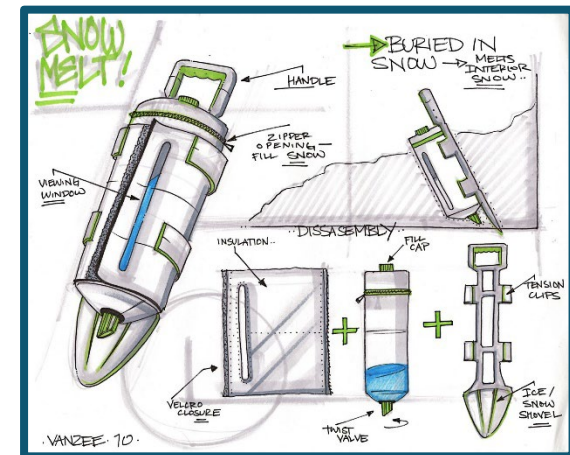

1.3. CLAVES DE ÉXITO EN EL DESARROLLO DE UN PROYECTO

Un proyecto exitoso es aquel que....

3. Identifica a los interesados y sus necesidades de comunicación



Los interesados son todas las personas interesadas en el proyecto, comenzando por el director del proyecto, su equipo, el o los promotores, el cliente, la comunidad, etc.

1.3. CLAVES DE ÉXITO EN EL DESARROLLO DE UN PROYECTO

Un proyecto exitoso es aquel que....

4. Identifica las premisas y restricciones del proyecto

¿Cuáles son las suposiciones de las cuales partimos?

¿Qué nos limita?

Los horarios, el clima, la disponibilidad de divisas, el presupuesto, la disponibilidad de maquinaria especializada



1.3. CLAVES DE ÉXITO EN EL DESARROLLO DE UN PROYECTO

Un proyecto exitoso es aquel que....

5. Identifica los riesgos del proyecto



¿Cuáles son aquellos factores que podrían poner en riesgo el éxito del proyecto?

¿Qué debemos hacer para mitigar o eliminar esos riesgos?

1.3. CLAVES DE ÉXITO EN EL DESARROLLO DE UN PROYECTO

Un proyecto exitoso es aquel que....

6. Documenta y comunica el plan de proyecto

Documentar el plan integrado y las bases de su creación, los progresos, llevar una bitácora del proyecto, las lecciones aprendidas y comunicar el plan a todos los interesados



1.3. CLAVES DE ÉXITO EN EL DESARROLLO DE UN PROYECTO

Un proyecto exitoso es aquel que....

7. Integra el equipo de proyecto



Compartir la visión del proyecto, tener una comunicación asertiva, darse retroalimentación frecuente, compartir el conocimiento, mantenerse saludable, física y emocionalmente y mantener un balance vida-trabajo

2. ¿QUÉ ES LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS?

La dirección de proyectos involucra

Conocimientos



Habilidades




Herramientas



Técnicas






2. ¿QUÉ ES LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS?

¿Qué es la dirección de proyectos?


Es la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para satisfacer los requerimientos de éste.



2.1. DIRECCIÓN DE PROYECTOS

Dirigir un proyecto incluye:

- Identificar requisitos.
- Abordar las diversas necesidades, inquietudes y expectativas de los interesados en la planificación y la ejecución del proyecto.
- Establecer, mantener y realizar comunicaciones activas, eficaces y de naturaleza colaborativa entre los interesados.
- Gestionar a los interesados para cumplir los requisitos del proyecto y generar los entregables del mismo.
- Equilibrar las restricciones contrapuestas del proyecto
 - o El alcance.
 - o El cronograma.
 - o Los recursos.
 - o La calidad.
 - o El presupuesto.
 - o Los riesgos.



2.1. DIRECCIÓN DE PROYECTOS


GESTIÓN DE PROYECTOS

¡NO ES SOLO PROGRAMAR!


2.2. AREAS DE GESTIÓN DE PROYECTOS



2.3. PROCESOS DE GESTIÓN DE PROYECTOS

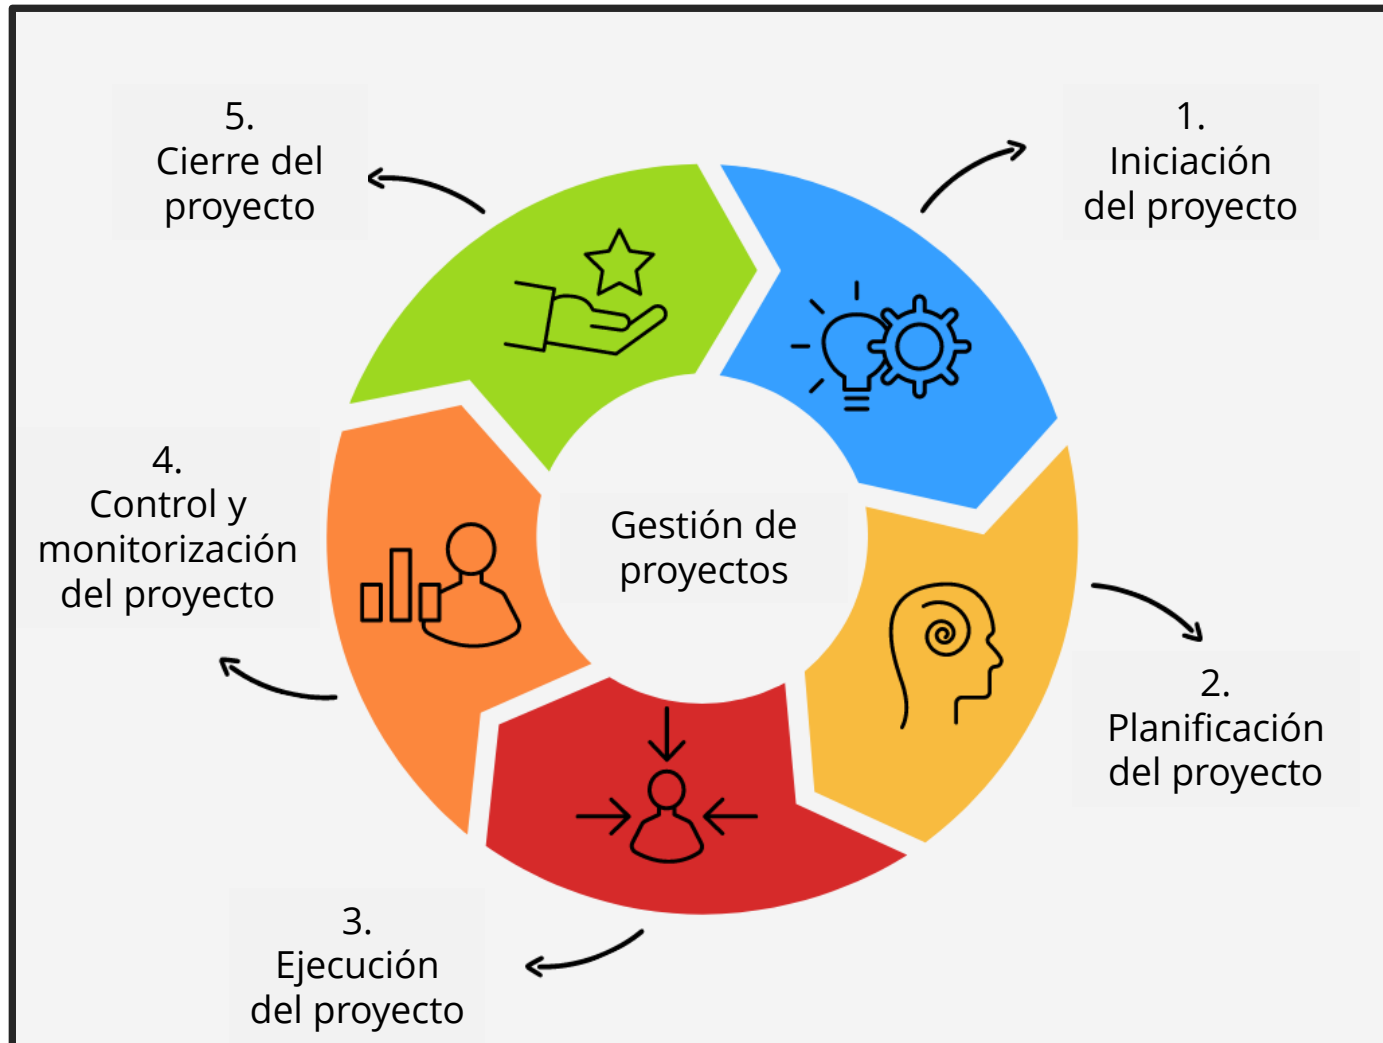

2.3. PROCESOS DE GESTIÓN DE PROYECTOS

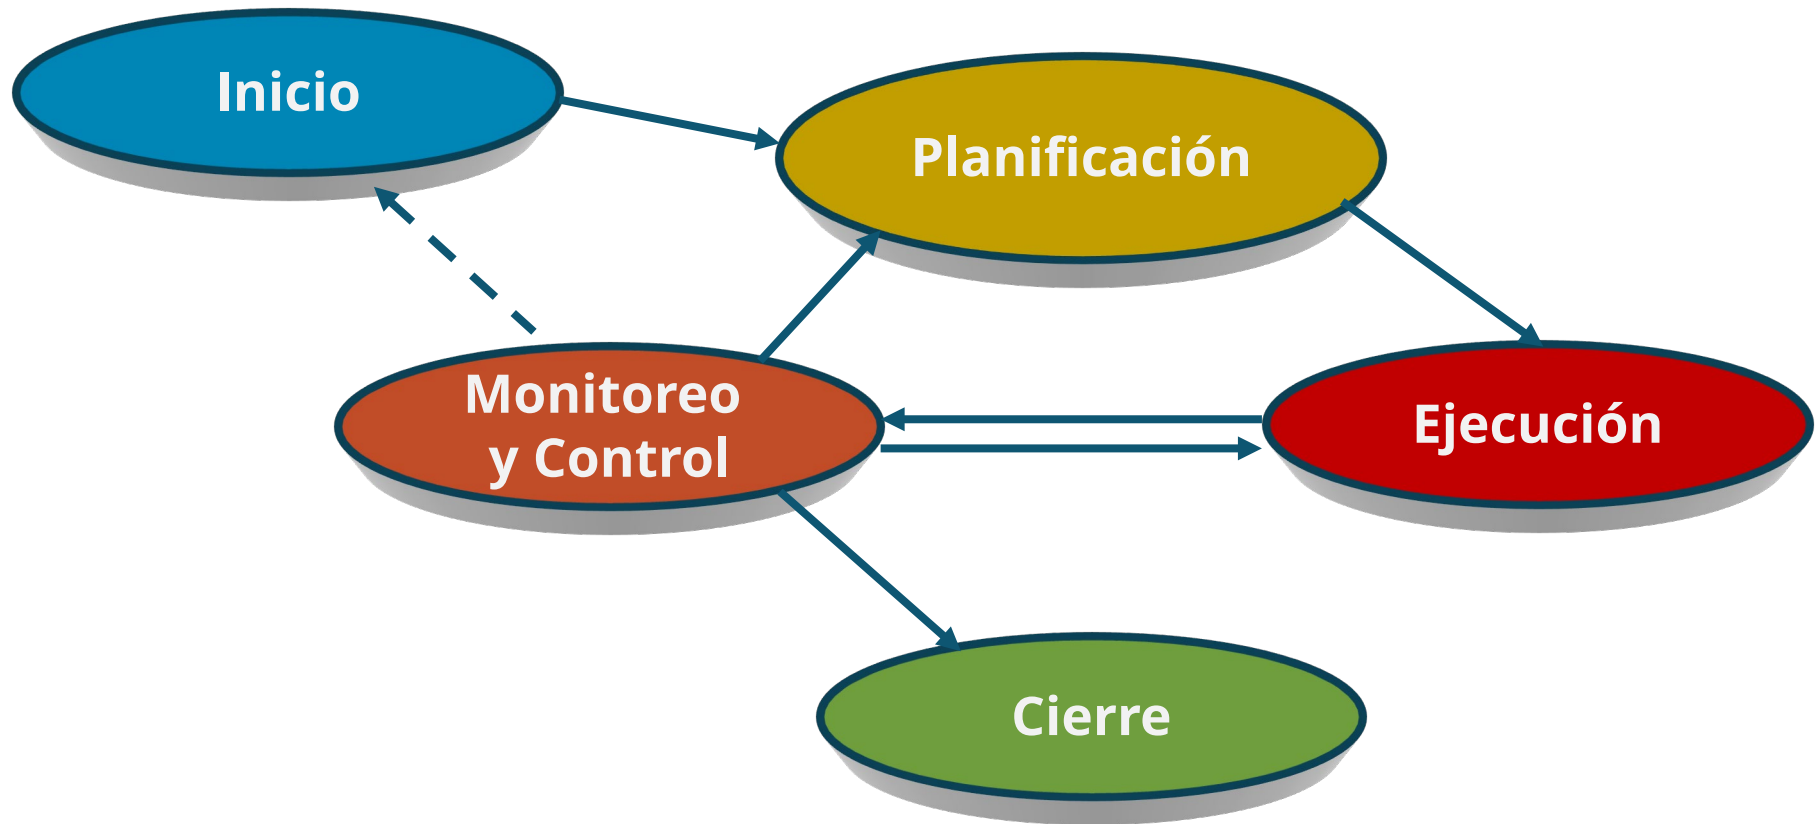

2.3. PROCESOS DE GESTIÓN DE PROYECTOS

1) GESTIÓN DE INTEGRACIÓN

1. Desarrollar el Acta Constitución proyecto
2. Desarrollar el Plan para la Dirección del Proyecto
3. Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto
4. Gestionar el conocimiento del proyecto
5. Monitorear y controlar el trabajo del proyecto.
6. Realizar el control integrado de cambios
7. Cerrar el proyecto o fase

2) GESTIÓN DE ALCANCE

1. Planificar la Gestión del alcance.
2. Recopilar requisitos
3. Definir el alcance
4. Crear la EDT/WBS
5. Validar del alcance.
6. Controlar el alcance

3) GESTIÓN DEL TIEMPO

1. Planificar la gestión del cronograma
2. Definición de las actividades.
3. Secuenciar las actividades.
4. Estimar la duración de las actividades.
5. Desarrollar el cronograma
6. Controlar el cronograma

10) GESTIÓN DE LOS INTERESADOS

1. Identificar a los interesados
2. Planificar el involucramiento de los interesados
3. Gestionar la participación de los interesados
4. Monitorear el involucramiento de los interesados

9) GESTIÓN DE APROVISIONAMIENTOS

1. Planificar la gestión de las adquisiciones.
2. Efectuar las adquisiciones.
3. Controlar las adquisiciones.

8) GESTIÓN DE LOS RIESGOS

1. Planificar la Gestión de Riesgos.
2. Identificar los Riesgos.
3. Realizar el Análisis cualitativo de Riesgos
4. Realizar el Análisis cuantitativo de Riesgos
5. Planificar la Respuesta a los Riesgos
6. Implementar la respuesta a los riesgos
7. Monitorear los Riesgos

7) GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES

1. Planificar la gestión de las Comunicaciones
2. Gestionar la Comunicaciones
3. Monitorear las comunicaciones

4) GESTIÓN DE LOS COSTOS


1. Planificar la gestión de costos
2. Estimar los costos.
3. Determinar el presupuesto
4. Controlar los costes

5) GESTIÓN DE LA CALIDAD

1. Planificar la gestión de calidad
2. Gestionar la Calidad
3. Controlar la Calidad

6) GESTIÓN DE LOS RECURSOS

1. Planificar la gestión de los Recursos
2. Estimar los recursos de las actividades
3. Adquirir recursos
4. Desarrollar el Equipo
5. Dirigir el equipo del proyecto
6. Controlar los recursos

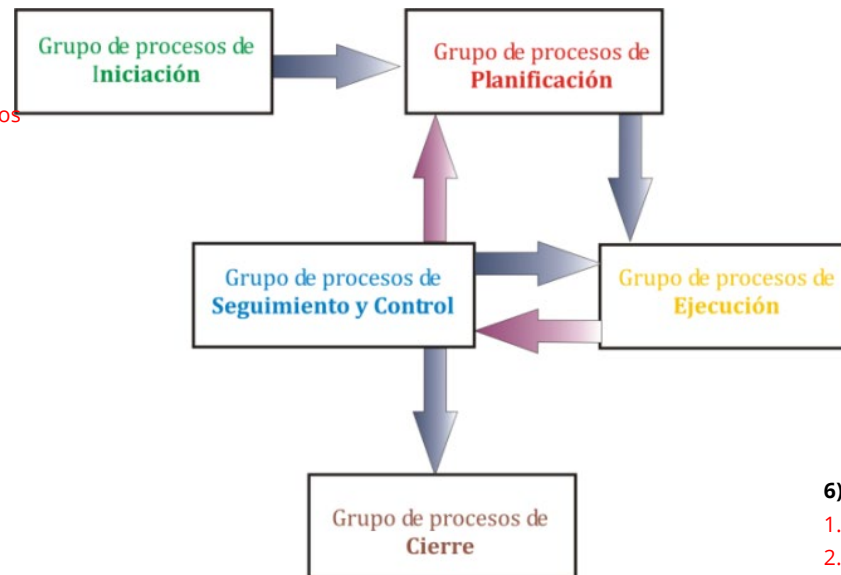

3. ESTÁNDARES DE DIRECCIÓN DE PROYECTOS

- NORMA UNE-ISO 21500:2022. Gestión de proyectos, programas y carteras de proyectos. Contexto y conceptos.  
- NORMA UNE-ISO 21502:2022. Dirección y gestión proyectos, programas y carteras de proyectos. Directrices para la dirección y gestión de proyectos.  
- PRINCE2 (PROjects IN Controlled Environments)  
- PMP (Project Management Professional) del PMI

