



TEMA 3.

INICIO DEL PROYECTO

Índice

1. Definición del problema

1.1. Misión, visión y problema

1.2. Objetivos del proyecto

2. Inicio el proyecto

2.1. Resultados del inicio del proyecto

3. Acta de Constitución del Proyecto

3.1. Documentación necesaria para elaborar el Acta de Constitución

3.2. Significado del Acta de Constitución

3.3. Contenido del Acta de Constitución

4. Identificación de las partes interesadas

4.1. Funciones de las partes interesadas


4.2. Priorizar las partes interesadas

1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

"Tengo un problema. Mi coche se ha parado y no tengo forma de ir a trabajar. ¿Cómo voy a reparar mi coche si no tengo dinero para hacerlo?"

El problema se ha definido esencialmente como:

"¿Cómo reparo mi coche?"



Sin embargo, el problema real, en su nivel más fundamental, es que la **persona no tiene forma de llegar al trabajo**, o eso dice. Pero ¿podría viajar en autobús, ir con un compañero de trabajo o andar en bicicleta hasta que tenga el dinero para reparar el automóvil?

1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA



"La compañía ha gastado mucho dinero en el desarrollo de este nuevo producto, y ninguno de ustedes lo está vendiendo.

¡Si no sales y vendes este producto, voy a encontrar algunos vendedores que puedan vender!"

Está claro cómo ha definido el problema: tiene un grupo de vendedores, gente que no puede vender.


Sin embargo, dado que ninguno de ellos puede vender el producto, seguro que se equivoca. Hay algo mal con el producto o el mercado, o la competencia los está matando. **¡Es muy poco probable que tengas todos los vendedores malos!**

Sin embargo, este gerente ha definido el problema en términos de personas, y esa es la forma en que debe resolverse. Imagínate que reemplaza a todos los vendedores. Seguirá teniendo el mismo problema porque no ha abordado la causa real.

1.1. MISIÓN, VISIÓN, PROBLEMA

Supongamos que una persona te dice que está aceptando un nuevo trabajo en una ciudad lejana y planea mudarse allí. Inmediatamente se da cuenta de que debe encontrar un lugar para vivir.

Así que ella dice: "Tengo un problema. Tengo que encontrar un lugar para vivir".

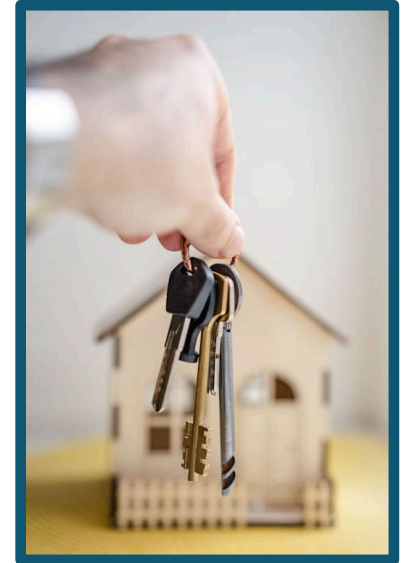


Problema: No tengo dónde vivir			
Visión	Debe tener	Querría tener	Sería genial si tiene
	• 3 habitaciones • 2 plazas de garaje • Jardín • Gran salón	• Espacio para despacho • Sótano	• Chimenea en el salón
Misión: Encontrar un lugar que cumpla con todos los requisitos y con la mayor cantidad posible de extras deseados.			

1.1. MISIÓN, VISIÓN, PROBLEMA

- La misión es siempre lograr la visión.
- La visión que se está tratando de lograr es la que tiene el cliente, es decir, **se está tratando de satisfacer las necesidades del cliente.**
 - Debes saber cuáles son esas necesidades, y a veces esto no es fácil porque ni siquiera el cliente las tiene claras.
 - Tienes que traducir o interpretar lo mejor que puedas las necesidades del cliente.
 - El cliente debe mantenerse involucrado en el proyecto desde el concepto hasta la finalización, para que haya un control constante de si lo que está haciendo logrará el resultado deseado.

La misión del proyecto se puede redactar respondiendo a dos preguntas:

1. ¿Qué vamos a hacer?
2. ¿Para quién lo vamos a hacer?




1.2 . OBJETIVOS DEL PROYECTO

Es posible que quiera terminar este tema a las 10 de la mañana. Ese es mi resultado deseado, mi objetivo. La forma en que logro este objetivo es realizar una serie de tareas. Estos pueden incluir escribir texto en mi ordenador, revisar alguna otra literatura sobre el tema sobre el que estoy escribiendo, llamar a un colega para hacer una pregunta para obtener una aclaración, imprimir el capítulo, revisarlo y redactar algunas revisiones en mi ordenador.

Un objetivo especifica un resultado final deseado que se debe lograr.

Una tarea es una actividad que se realiza para lograr ese resultado.

Un objetivo suele ser un sustantivo, mientras que una tarea es un verbo.



1.2 . OBJETIVOS DEL PROYECTO

Preguntas útiles tanto para establecer objetivos como para monitorear el progreso hacia esos objetivos:

1. ¿Cuál es el resultado deseado? A esto se le llama **marco de resultados**.


Te ayuda a mantenerte enfocado en el resultado que estás tratando de lograr, en lugar del esfuerzo que se gasta para llegar allí.

2. ¿Cómo sabremos cuándo lo conseguimos? A esto se le llama **cuestión de la evidencia**.

Esta pregunta es muy útil para establecer criterios de salida para objetivos que no se pueden cuantificar.

1.3. MISIÓN, VISIÓN, PROBLEMA Y OBJETIVOS

Concepto	¿Qué es?	Enfoque	Pregunta que responde	Ejemplo en una planta industrial
Misión	Propósito actual de la organización o proyecto	Presente	¿Para qué existe?	"Reciclar aceite usado para proteger el medio ambiente y generar valor sostenible."
Visión	Imagen futura deseada	Futuro	¿Qué queremos llegar a ser?	"Ser la planta líder en reciclaje de aceite en Europa para 2030."
Problema	Situación que requiere solución	Diagnóstico	¿Qué obstáculo enfrentamos?	"El layout actual genera cuellos de botella y baja eficiencia en la logística interna."
Objetivos	Metas concretas que se quieren alcanzar	Acción	¿Qué queremos lograr?	"Reducir los tiempos de transporte interno en un 30% en 6 meses."



2 . INICIO DEL PROYECTO

Primeras preguntas

- ¿Por qué se inicia el proyecto?
- ¿Cuál es el objetivo del proyecto?
- ¿Qué producto o servicio debemos realizar?
- ¿Cuándo debemos entregarlo?
- ¿Qué calidad se requiere para su realización y entrega?
- ¿Cuál es la inversión necesaria o el coste asociado al mismo?


Preguntas fundamentales


- ¿Por qué debemos realizar el proyecto?
- ¿Qué se supone que vamos a hacer?
- ¿Quiénes son los interesados? ¿Cliente? ¿Patrocinador?

2.1. RESULTADOS DEL INICIO DEL PROYECTO

1. **Acta de Constitución del proyecto**
2. **Registro de interesados**

Enunciado del trabajo del proyecto (SOW)
Caso de negocio
Acuerdos

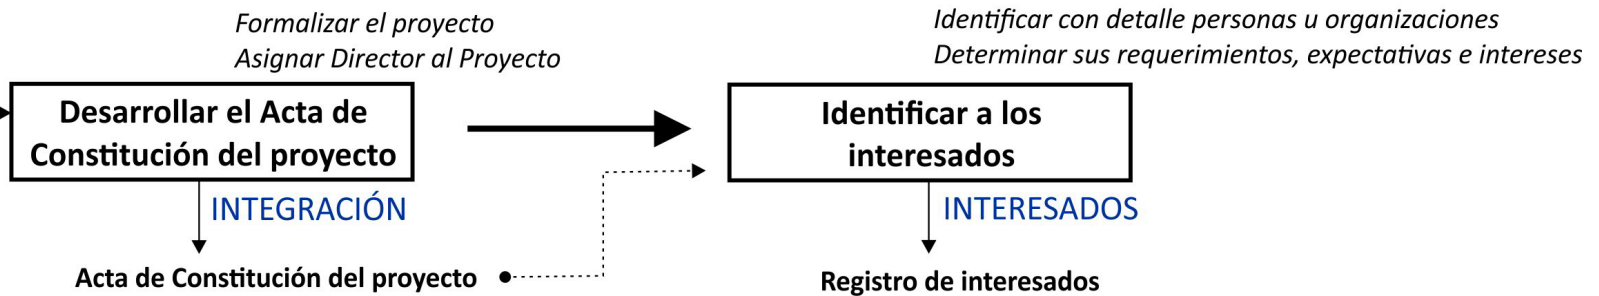




3. ACTA DE CONSTITUCIÓN


El Acta de Constitución es un documento emitido por el patrocinador, que autoriza formalmente la existencia de un proyecto y confiere al director del proyecto la autoridad para asignar los recursos de la organización a las actividades del proyecto.

Documenta las necesidades de negocio, los supuestos, las restricciones, el conocimiento de las necesidades y requisitos de alto nivel del cliente y el nuevo producto, servicio o resultado que el proyecto debe proporcionar



3.1. SIGNIFICADO DEL ACTA DE CONSTITUCIÓN

- Es el documento que da inicio al proyecto, su punto de partida.
- Es un documento preliminar todavía no hay nada totalmente definido.
- Refleja la relación entre la estrategia organizacional y el proyecto, a través del alcance del proyecto y el tiempo y coste estimado
- Se cita expresamente al director del proyecto que se asigna.
- Se deben citar:
 - las necesidades que tiene el cliente y que dan origen al proyecto,
 - una serie de restricciones que el proyecto puede tener,
 - los requisitos de alto nivel referentes al producto que va a desarrollar el proyecto.



3.2. DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA ELABORAR EL ACTA DE CONSTITUCIÓN

DATOS DE PARTIDA PARA ELABORAR EL

ACTA DE CONSTITUCIÓN

ENUNCIADO DEL TRABAJO DEL PROYECTO


El Enunciado del Trabajo del Proyecto (SOW) es una descripción narrativa de los productos, servicios o resultados que debe entregar el proyecto.

CASO DE NEGOCIO

El caso de negocio o documento similar proporciona la información necesaria desde una perspectiva de negocio para determinar si el proyecto es viable o no en términos de la inversión requerida.

ACUERDOS


Los acuerdos se establecen para definir las intenciones iniciales de un proyecto. Normalmente se utiliza un contrato cuando se lleva a cabo el proyecto para un cliente externo.



3.3. CONTENIDO DEL ACTA DE CONSTITUCIÓN

El Acta de Constitución suele incluir:

- Justificación del proyecto: problema, oportunidad, requisito de negocio, etc.
- Objetivos medibles y criterios de éxito
- Requisitos generales y límites del proyecto
- Descripción general del proyecto y principal entregable
- Riesgos preliminares
- Resumen del cronograma de hitos
- Presupuesto preliminar resumido
- Criterios de aprobación: ¿qué criterios deben cumplirse para que sea un proyecto exitoso? ; ¿quién aprueba y firma si se cumplieron esos criterios?; ¿cuáles son los criterios para cancelar o abortar el proyecto?
- Director del proyecto, responsabilidad y nivel de autoridad
- Interesados principales
- Patrocinador que firmará al acta y nivel de autoridad



4. IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS

1. ¿Quién se beneficia del proyecto?


Concéntrese en el entregable del proyecto y en quién se beneficiará de él. El entregable puede ser cualquier cantidad de cosas, incluido un nuevo proceso interno, una aplicación de software o un nuevo producto que se comercializará.

2. ¿Quién contribuye al proyecto?

Determine en qué personas o grupos confiará para llevar a cabo el trabajo del proyecto. Esto podría incluir a los miembros del equipo del proyecto, al patrocinador del proyecto y a expertos en la materia ajenos al equipo del proyecto.

3. ¿A quién afecta el proyecto?

El entregable del proyecto puede afectar a otras personas que no necesariamente se benefician de él, como el departamento de TI que actualiza el software para los compradores o el ingeniero que proporciona datos prioritarios para una nueva campaña de marketing. Estas personas y grupos deben ser considerados partes interesadas porque su trabajo se verá afectado por el entregable.



4. IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS

Se debe identificar a los interesados desde el comienzo del proyecto para analizar sus expectativas y su poder de influencia.

Esta identificación puede ocurrir antes de la firma del acta de constitución o junto con el desarrollo del acta.

Además, se deberán seguir identificando interesados a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto.

Registro de interesados

- Documentar todas las personas u organizaciones cuyos intereses puedan ser afectados de manera positiva o negativa por el proyecto, como así también todos los que influyan sobre el proyecto y aquellos que perciban que se verán afectados por el proyecto.
- Documentar cuáles son sus intereses, cuál es su nivel de involucramiento en el proyecto, cómo son sus interdependencias y cuál es su potencial influencia sobre el proyecto.

4.1. FUNCIONES DE LAS PARTES INTERESADAS


	Inicio	Planificación	Ejecución	Control	Cierre
Patrocinador	- Financia el proyecto. - Colabora en la elaboración del Acta de Constitución del Proyecto.	Aprueba el Plan de Gestión del Proyecto.	- Resuelve los conflictos fuera del control del director de proyectos. - Resuelve las dudas sobre el alcance.	- Aprueba o rechaza los cambios. - El único autorizado para cambiar el acta de Constitución del Proyecto.	Aceptación formal de los entregables.
Equipo		- Crean la EDT - Participan en la planificación del cronograma, costes y riesgos.	Ejecutan las actividades del proyecto.	Recomiendan cambios y acciones correctivas.	Cierre formal de las fases del proyecto.
Usuarios finales	Pueden participar en la elaboración del Acta de Constitución del Proyecto.	Pueden participar en la creación de la declaración del alcance.		Pueden participar en la aprobación de los cambios y aceptación de entregables.	
Director de Proyectos	- Puede ayudar a elaborar el Acta de Constitución del Proyecto. - Está a cargo del proyecto, no necesariamente de los recursos.	Lidera y dirige los esfuerzos de planificación.	- Influye en el equipo y en el entorno para crear las condiciones propicias de trabajo. - Realiza el seguimiento del desempeño de los miembros del equipo.	- Determina la necesidad de elevar las peticiones de cambios. - Recomienda acciones correctivas y preventivas, reparación de defectos.	Cierre formal de las fases del proyecto y del proyecto completo.

4.1. FUNCIONES DE LAS PARTES INTERESADAS

	Inicio	Planificación	Ejecución	Control	Cierre
Gerente Funcional		Participa en la planificación de RRHH.	Asigna personas al equipo.	Recomiendan cambios y acciones correctivas.	
Director de Programas	Se asegura de que los proyectos elegidos contribuyen a los objetivos estratégicos de la organización.		- Gestiona proyectos relacionados para obtener resultados inalcanzables si se gestionaran separadamente. - Dirige el trabajo de los directores de proyecto.	Emite recomendaciones para que los proyectos produzcan el mayor beneficio para el programa.	
Director de Portafolios	Se asegura de que los proyectos elegidos crean valor para la organización.		- Gestiona proyectos no relacionados - Consigue apoyos del personal ejecutivo para los proyectos individuales.	Emite recomendaciones para maximizar el ROI.	

4.2. PRIORIZAR LAS PARTES INTERESADAS

Matriz de clasificación de interesados: categorizar a los interesados según su poder/interés, poder/influencia e impacto/influencia.

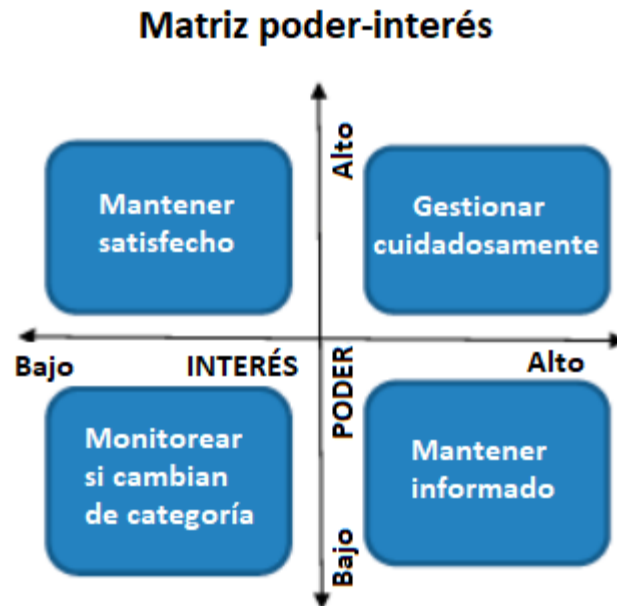

Poder = autoridad sobre el proyecto


Interés = nivel de preocupación por el proyecto

Influencia = participación activa

Impacto = capacidad de efectuar cambios a la planificación o ejecución del proyecto


4.2. PRIORIZAR LAS PARTES INTERESADAS

Cubo de interesados: gráfico tridimensional para clasificar a los interesados según su poder (influyente o insignificante), interés (activo o pasivo) y actitud (partidario o bloqueador).

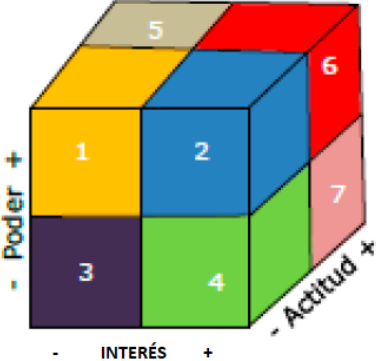	Cubo	Poder	Interés	Actitud	Categoría
	1	+	-	-	Influyente pasivo bloqueador
	2	+	+	-	Influyente activo bloqueador
	3	-	-	-	Insignificante pasivo bloqueador
	4	-	+	-	Insignificante activo bloqueador
	5	+	-	+	Influyente pasivo partidario
	6	+	+	+	Influyente activo partidario
	7	-	+	+	Insignificante activo partidario
	8	-	-	+	Insignificante pasivo partidario

4.2. PRIORIZAR LAS PARTES INTERESADAS

Modelo de prominencia: clasificar a los interesados según su preponderancia o rasgo sobresaliente considerando su poder, legitimidad y urgencia.

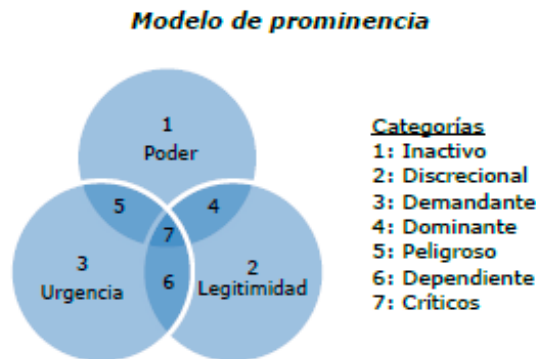

Prioridad	Categorías		
Baja	1 Inactivo Poder	2 Discrecional Legitimidad	3 Demandante Urgencia
Media	4 Dominante Poder + Legitimidad	5 Peligroso Poder + Urgencia	6 Dependiente Legitimidad + Urgencia
Alta	7 Críticos Poder + Legitimidad + Urgencia		

Poder: autoridad o habilidad de los interesados para influir sobre el proyecto.

Legitimidad: nivel de involucramiento apropiado de los interesados en el proyecto.


Urgencia: tiempo de respuesta que esperan los interesados para satisfacer sus expectativas.

4.2. PRIORIZAR LAS PARTES INTERESADAS

Priorización: En función de las características identificadas en los interesados, priorizar categorías según su importancia relativa.


Por ejemplo, si hemos identificado el poder, interés e impacto de cada interesado como bajo o alto, podríamos definir las priorizaciones como se presenta en la tabla a continuación.

Poder	Interés	Impacto	Prioridad
Alto	Alto	Alto	1º
Alto	Alto	Bajo	2º
Alto	Bajo	Alto	2º
Bajo	Alto	Alto	2º
Alto	Bajo	Bajo	3º
Bajo	Alto	Bajo	3º
Bajo	Bajo	Alto	3º
Bajo	Bajo	Bajo	4º



PUNTOS CLAVE PARA RECORDAR

- La forma en que se define un problema determina cómo lo resolverá.
- Un problema es una brecha entre donde estás y donde quieres estar, con obstáculos que dificultan alcanzar la meta. Un objetivo en sí mismo no es un problema.
- La visión es cómo "se verá" el resultado final.
- La misión es lograr la visión. Responde a las dos preguntas "¿Qué vamos a hacer?" y "¿Para quién lo vamos a hacer?"
- Los objetivos deben ser SMART.
- Una parte interesada es cualquier persona que tenga un interés personal en el resultado de un proyecto.
- La gestión de las partes interesadas comienza con la identificación de la persona haciendo tres preguntas básicas: (1) ¿Quién se beneficia del proyecto? (2) ¿Quién contribuye al proyecto? (3) ¿A quién afecta el proyecto?



PUNTOS CLAVE PARA RECORDAR

- Debido a que las partes interesadas son clave para el éxito de un proyecto, deben estar comprometido o involucrado para que tenga éxito.
- El entorno cultural de una organización puede tener matices y, por lo tanto, requiere el trabajo del director del proyecto para medir la dinámica e impulsar una interacción eficaz con las partes interesadas.
- El tiempo y el esfuerzo deben invertirse en la interacción uno a uno con partes interesadas externas y remotas.

