



TEMA 4. PROCESOS DE PLANIFICACIÓN

Índice

1. Concepto general de planificación

1.1. Variables de la Planificación

1.2. Pasos para planificar un proyecto

2. Alcance del proyecto

2.1. Planificar la gestión del alcance del proyecto

2.2. Línea base del alcance

3. Planificar la gestión el cronograma del proyecto

3.1. Línea base del cronograma del proyecto

4. Planificar la gestión de costes del proyecto

4.1. Línea base de costes del proyecto

5. Planificar la gestión de riesgos

6. Planificar la gestión de recursos: equipo del proyecto

7. Planificar la gestión de las comunicaciones

8. Planificar la gestión de adquisiciones. Recursos físicos

9. Planificar la gestión de la calidad

10. Planificar la gestión de cambios

11. Métricas

1. CONCEPTO GENERAL DE PLANIFICACIÓN

Identificar o definir una ruta coordinada para lograr los resultados deseados.

¿QUIÉN?

¿QUÉ?

¿CUÁNDO?


¿CÓMO?

¿POR QUÉ?

¿CUÁNTO?





1.1. VARIABLES DE LA PLANIFICACIÓN

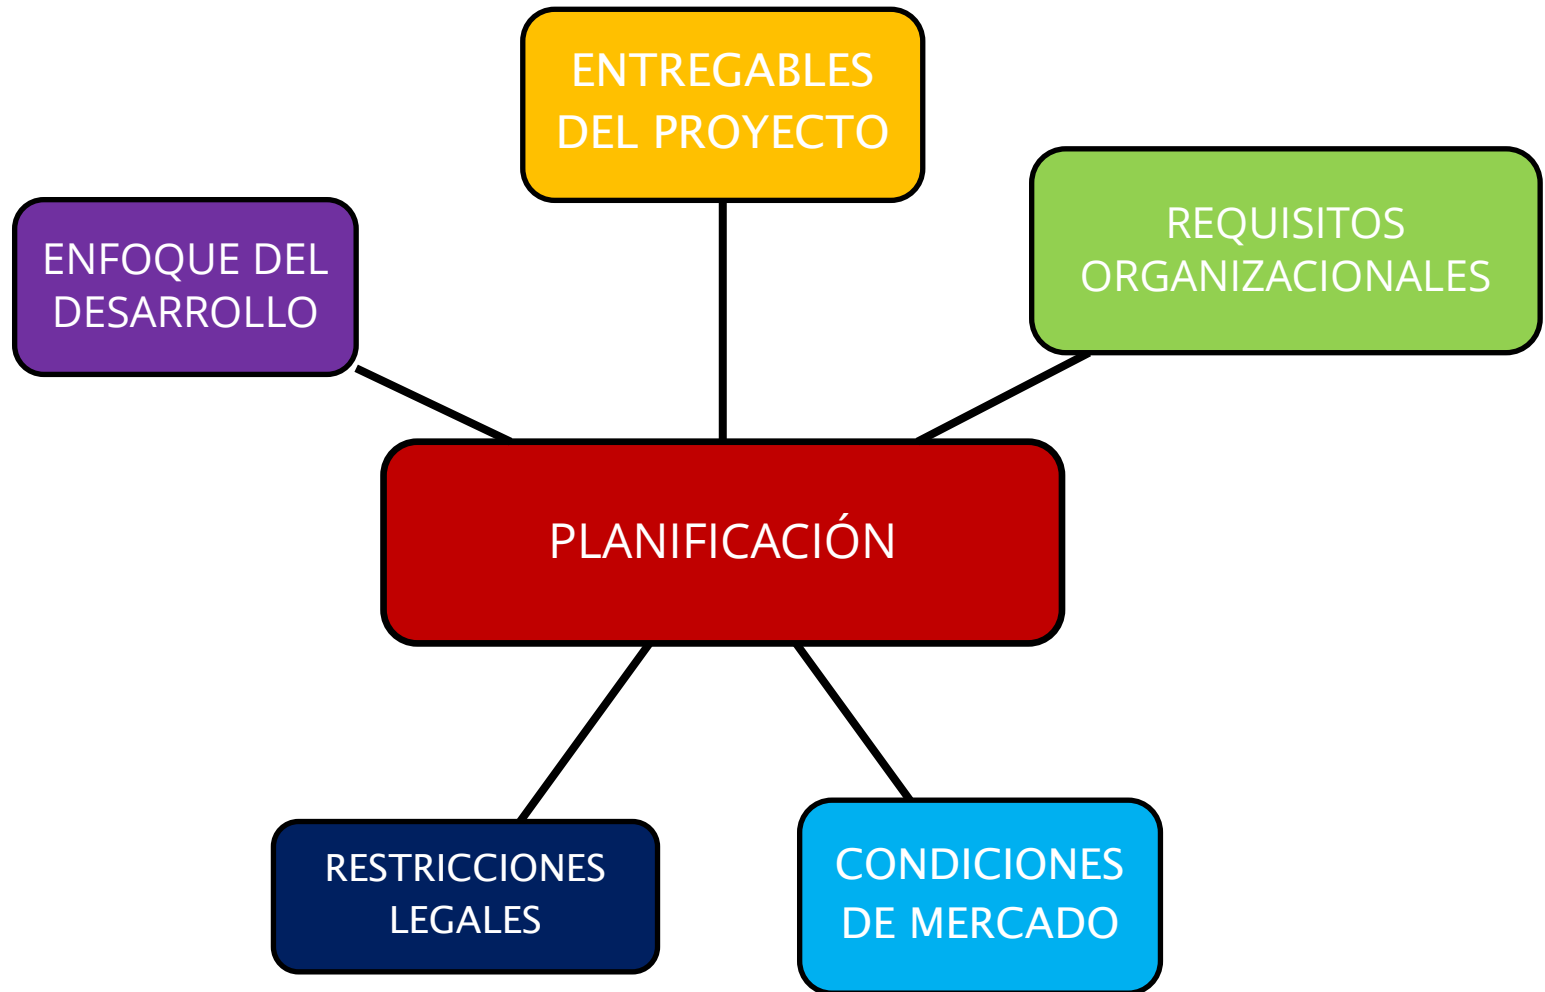

1.1.1. ENFOQUE DEL DESARROLLO


Enfoque de desarrollo: medio utilizado para crear y desarrollar el producto, servicio o resultado durante el ciclo de vida del proyecto.

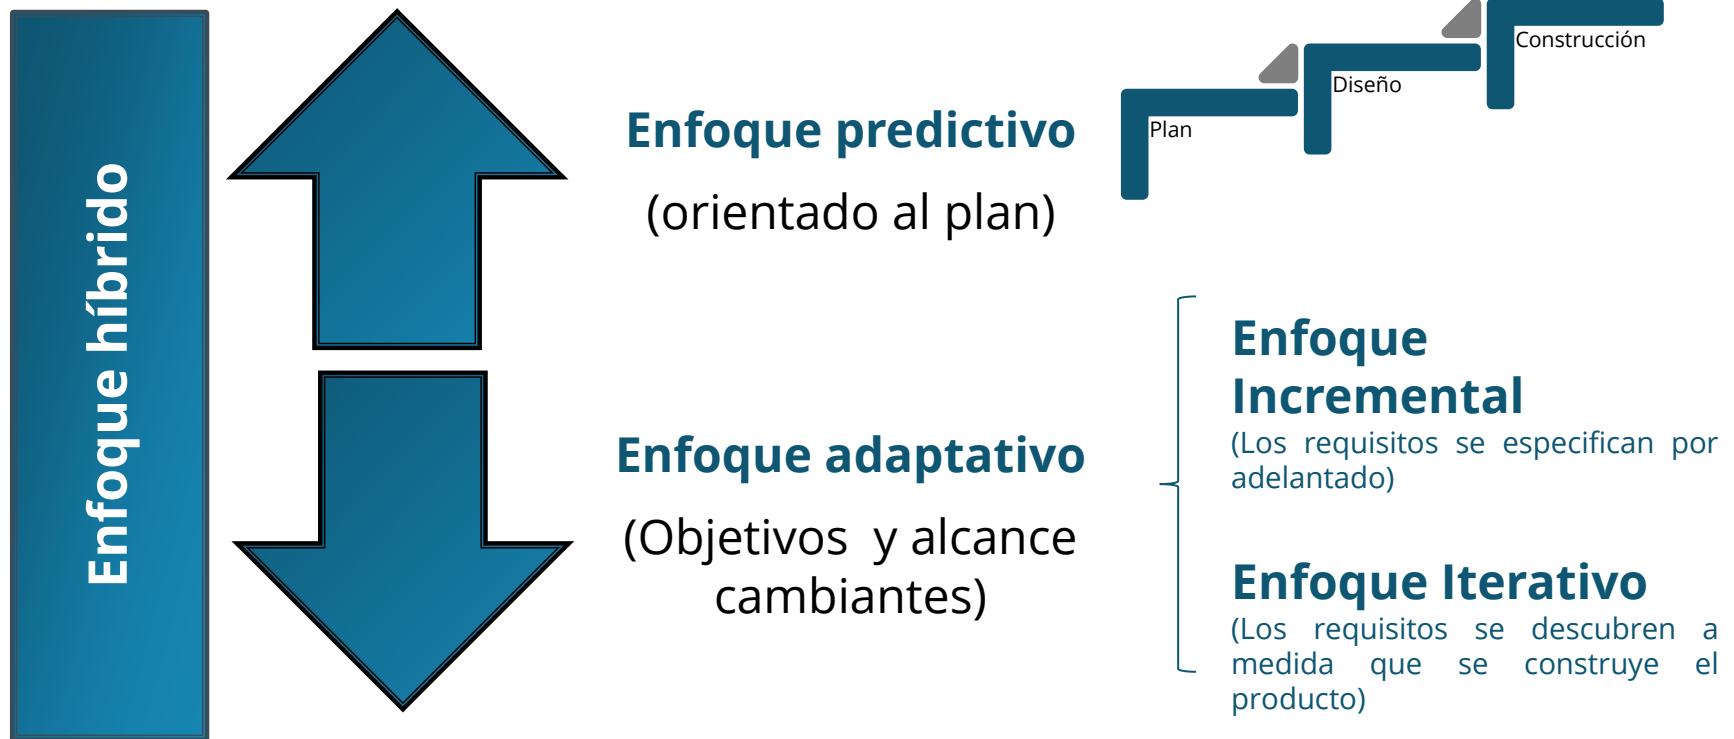



1.2. PASOS PARA PLANIFICAR UN PROYECTO

1. **Definir el objetivo.** ¿Qué quiero conseguir?, ¿Por qué necesito un proyecto? El objetivo tiene que ser conocido, pero también medible y, por supuesto, alcanzable.
2. **Establecer el alcance.** Qué forma parte del proyecto, qué es imprescindible para que pueda ejecutarse.
3. **Identificar recursos, costes y riesgos.** ¿Qué profesionales necesitas? ¿Qué habilidades deben tener? espacios de trabajo, equipos informáticos, licencias de software, material de oficina... También deben figurar costes, que pueden ser fijos (el alquiler de una oficina) o variables (la reparación de un ordenador) y la identificación de posibles riesgos durante el desarrollo del proyecto
4. **Desglose de tareas.** Especificar qué hay que hacer y quién lo hace y cuándo. EDT y matriz RAM o de asignación de responsabilidades,
5. **Calendarización.** Define cuándo se hace cada tarea.




1.2.1. Procesos de planificación por áreas


Iniciación	Planificación	Ejecución	Seguimiento y control	Cierre
	Gestión de la Integración			
	Gestión del Alcance		Gestión del Alcance	
	Gestión del Tiempo		Gestión del Tiempo	
	Gestión de los Costos		Gestión de los Costos	
	Gestión de la Calidad			
	Gestión de los Recursos			
	Gestión de las Comunicaciones			
	Gestión de los Riesgos			
	Gestión de las Adquisiciones			
	Gestión de los Interesados			

2. ALCANCE DEL PROYECTO

Alcance del producto : características y funciones que caracterizan a un producto o servicio

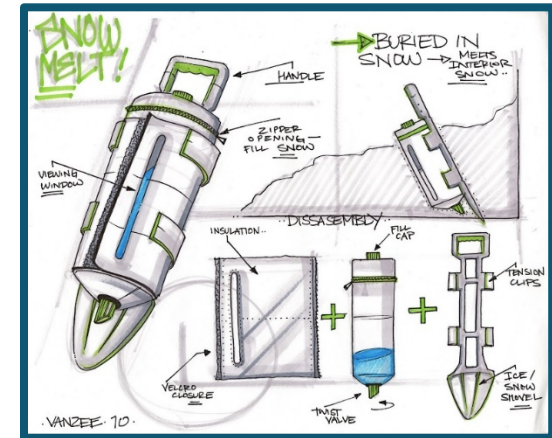

Alcance del proyecto : trabajo que se necesita realizar para elaborar y entregar un producto con las características y funciones especificadas




2.1. PLANIFICAR LA GESTIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO

Planificar la Gestión del Alcance supone describir los procesos requeridos que definirán qué hacer y qué no hacer en el proyecto para tener éxito.

- ¿Cómo determinar qué trabajo se tiene que hacer en mi proyecto?
- ¿Cómo asegurarme que se haga todo el trabajo previsto en mi proyecto?
- ¿Cómo asegurarme que no se haga trabajo no previsto en mi proyecto?
- ¿Cómo asegurarme de obtener la aceptación del trabajo realizado en mi proyecto?

2.2. LÍNEA BASE DEL ALCANCE

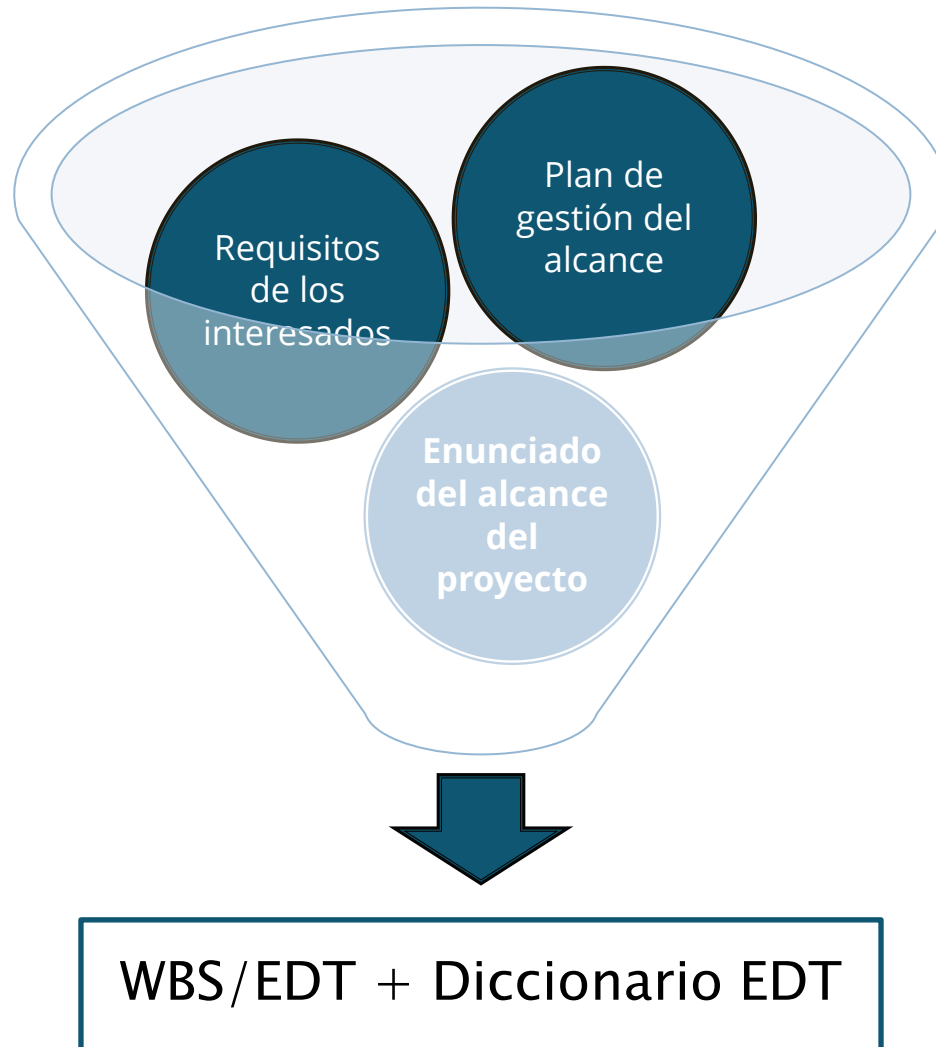




3. PLANIFICAR LA GESTIÓN DEL CRONOGRAMA DEL PROYECTO

Planificar la Gestión del Cronograma supone describir los procesos requeridos para desarrollar, gestionar, ejecutar y controlar el cronograma del proyecto.

Debe dar respuesta a las siguientes preguntas:

- ¿Qué herramientas se utilizarán para realizar el cronograma?
- ¿Cuál será el nivel de precisión en las estimaciones de tiempo?
- ¿Cómo se estimará la reserva para contingencias?
- ¿Cómo y cuándo se actualizará la línea base de tiempo?
- ¿Cuánto será el nivel de tolerancia de los desvíos del cronograma en relación a la línea base?
- ¿Qué reglas se utilizarán para definir el porcentaje de avance de una actividad?
- ¿Cuáles son las cuentas de control de la EDT para gestionar los avances?
- ¿Qué metodología y fórmulas se utilizará para reportar los avances? Por ejemplo, análisis del valor ganado.
- ¿Cómo y cuándo se presentarán los informes de avance?

3. LINEA BASE DEL CRONOGRAMA

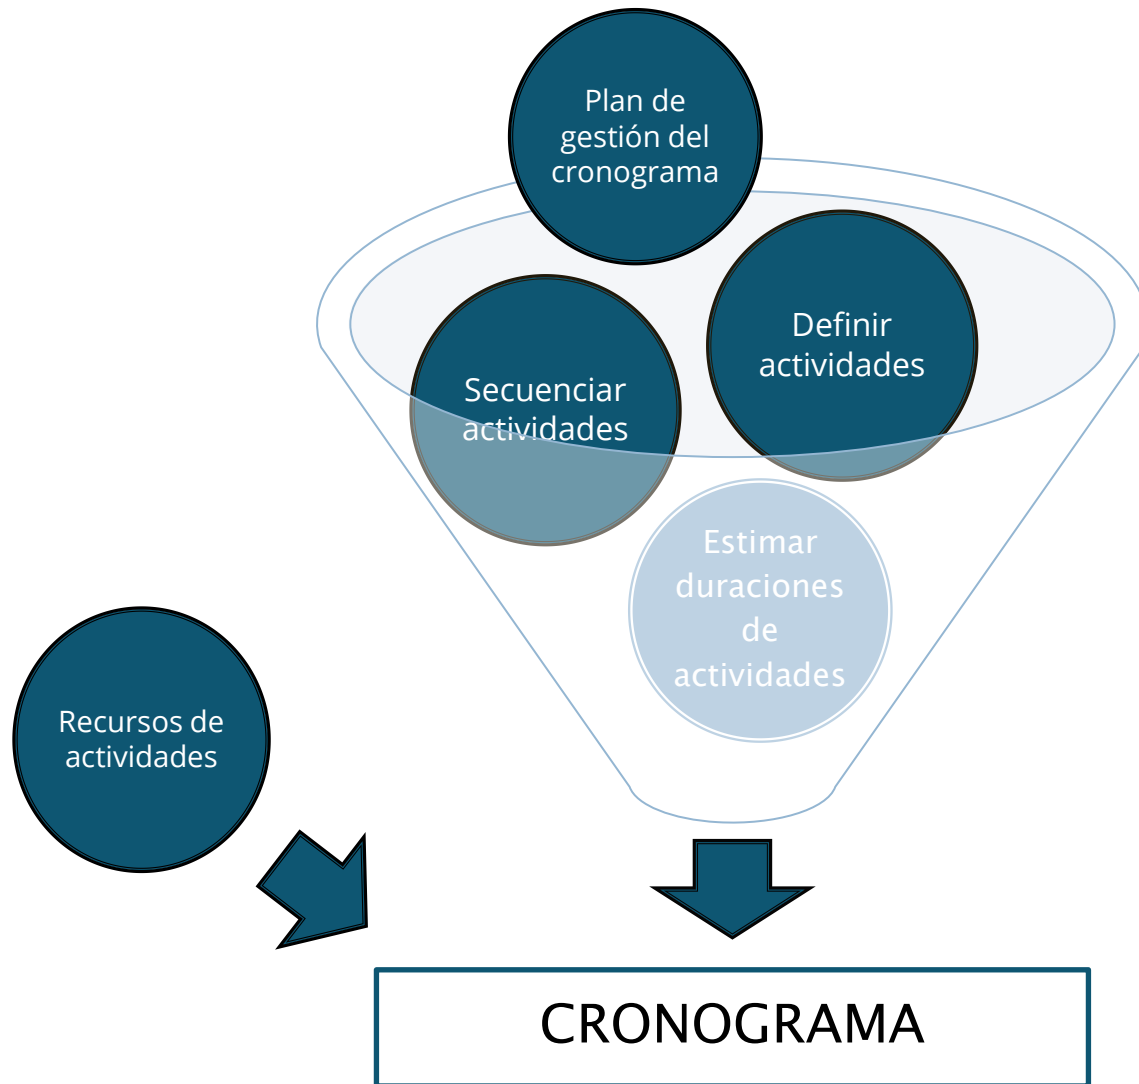


4. PLANIFICAR LA GESTIÓN DE COSTES DEL PROYECTO

El plan de gestión de los costes describe la forma en que se estructurarán y controlarán los costes del proyecto.

Debe dar respuesta a las siguientes preguntas:

- ¿Qué nivel de precisión vamos a utilizar? Por ejemplo, números redondeados sin decimales.
- ¿Cuál es el nivel de exactitud de las estimaciones de costos? Un nivel por orden de magnitud (ROM) podría variar entre -25% y +75%; mientras que una estimación definitiva sería un rango de +-10%.
- ¿Cuáles son los límites permitidos de variaciones en los costos?
- ¿Cómo administrar las variaciones de costos?
- ¿Cómo y cuándo realizar análisis de valor?
- ¿Qué procesos de gestión de costos se utilizarán?

4. LINEA BASE DE COSTES

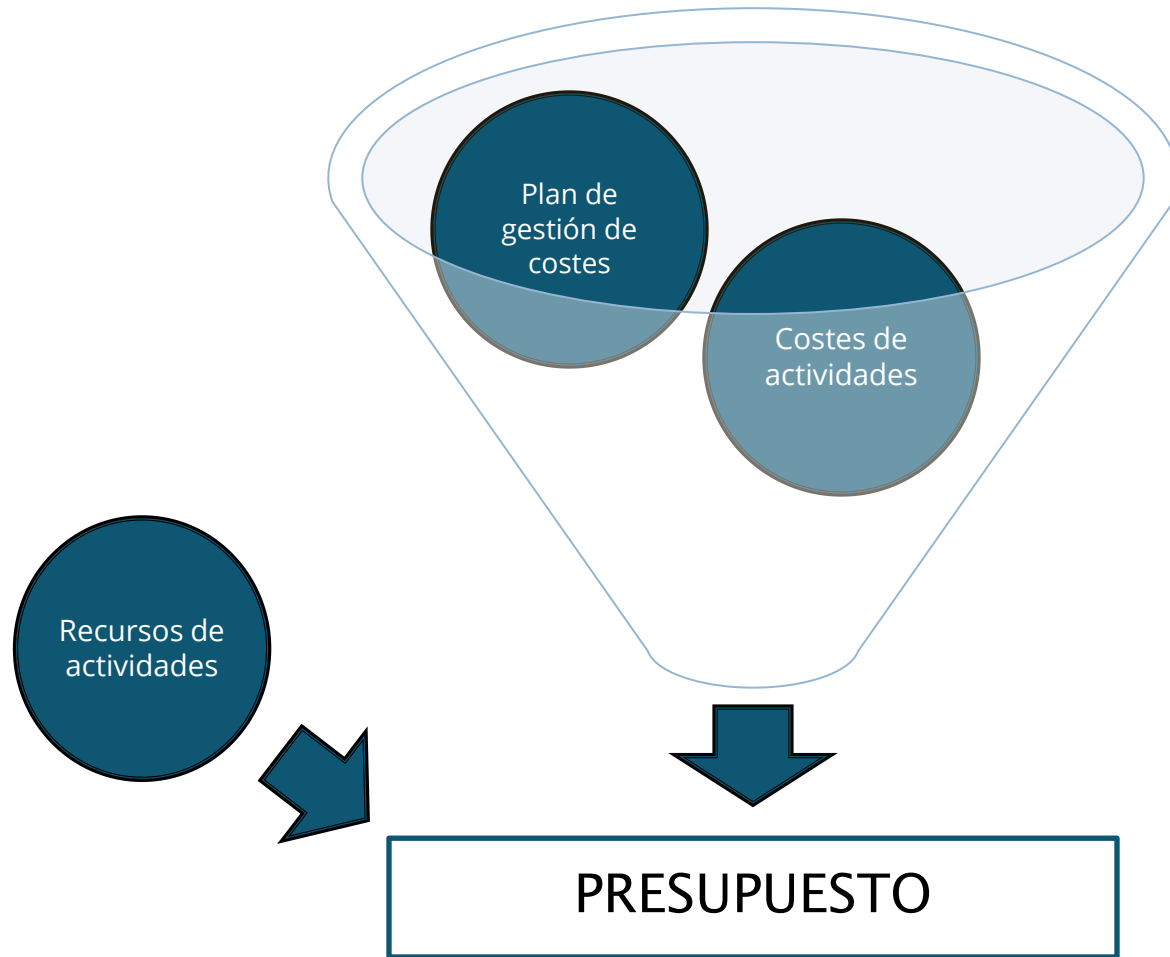



5. PLANIFICAR LA GESTIÓN DE RIESGOS

La suerte sonríe al que está preparado

Planificar la Gestión de Riesgos implica definir cómo realizar las actividades de gestión de riesgos para un proyecto.

El plan de gestión del riesgo debe dar respuesta a las siguientes cuestiones:

- ¿Qué metodología usaremos?
- ¿Cuáles serán los distintos roles relacionados con la gestión del riesgo, sus responsabilidades y su autoridad?
- ¿Qué presupuesto será preciso para sustentar las actividades de la gestión del riesgo?
- ¿Cuántas personas y recursos serán precisos, en qué medida y en qué momentos?
- ¿Cuáles son los umbrales de riesgo que la organización y los stakeholders están dispuestos a aceptar?

6. PLANIFICAR LA GESTIÓN DE RECURSOS

Planificar la gestión de recursos implicar definir cómo estimar, adquirir, gestionar y controlar los recursos. En relación a los recursos humanos, se definen los roles, responsabilidades y habilidades de los miembros del equipo, como así también las relaciones de comunicación.

Debe dar respuesta a:

- ¿Cómo estimar, adquirir y gestionar los recursos humanos?
- ¿Cómo y cuándo se incorporará y desafectará cada recurso?
- ¿Cómo asegurar que los recursos sean adecuados para las actividades?
- ¿Cuáles serán los roles y responsabilidades de los miembros del equipo?
- ¿Cuáles son las necesidades de formación del equipo?
- ¿Cómo será el plan de recompensas individual y grupal?
- ¿Cómo monitorear la disponibilidad de recursos?
- ¿Cómo impacta en otros proyectos la competencia por recursos escasos?

6. PLANIFICAR LA GESTIÓN DE RECURSOS: EQUIPO DE PROYECTO

Planificar la composición del equipo de proyecto

- **Identificación de las habilidades requeridas** para cumplir con el trabajo del proyecto. Esto implica evaluar no solo las habilidades, sino también el nivel de las competencias y los años de experiencia en proyectos similares.
- Sopesar los beneficios que aportan las **habilidades externas al proyecto frente** a los costos en los que se incurrirá con **el uso de miembros internos del equipo**
- Considerar la capacidad y la necesidad de que el equipo de proyecto **trabaje en el mismo lugar**.
- En **equipos virtuales** se requiere más tiempo en conectar a las personas por medio de la tecnología.



6. PLANIFICAR LA GESTIÓN DE RECURSOS: EQUIPO DE PROYECTO

Matriz RAM (Responsibility Assignment Matrix)

Actividad	Luis	Ana	Andrés
Búsqueda de información		X	
Estudio de mercado		X	
Análisis costo beneficio			X

X (responsable)

Actividad	Luis	Ana	Andrés
Búsqueda de información	A	R	C
Estudio de mercado	A	R	C
Análisis costo beneficio	I	A	R

Matriz RACI (R (responsable); A (accountable); C (consulted); I (informed))

R (responsable); A (accountable); C (consulted); I (informed)


Rol			Descripción
R	Responsable	Encargado	Quien realiza la tarea. Debería existir un solo encargado (R) por cada tarea; si existe más de uno, entonces el trabajo debería ser subdividido en menores niveles (uno para cada R).
A	Accountable	Responsable	Responsable de que la tarea se realice y de rendir cuentas sobre su ejecución. Debe existir una sola persona que rinda cuentas (A) sobre la tarea ejecutada por su encargado (R).
C	Consulted	Consultado	Posee alguna información o capacidad necesaria para realizar la tarea.
I	Informed	Informado	Debe ser informado sobre el avance de la tarea.

6.1. ESTIMAR LOS RECURSOS DE LAS ACTIVIDADES

Estimar los Recursos de las Actividades es el proceso de estimar tipo y cantidades de materiales, personas, equipos o suministros requeridos para llevar a cabo cada una de las actividades.

El beneficio clave de este proceso es que identifica el tipo, cantidad y características de los recursos necesarios para completar la actividad, lo que permite estimar el costo y la duración de manera más precisa.

Este proceso se lleva a cabo periódicamente a lo largo del proyecto, según sea necesario

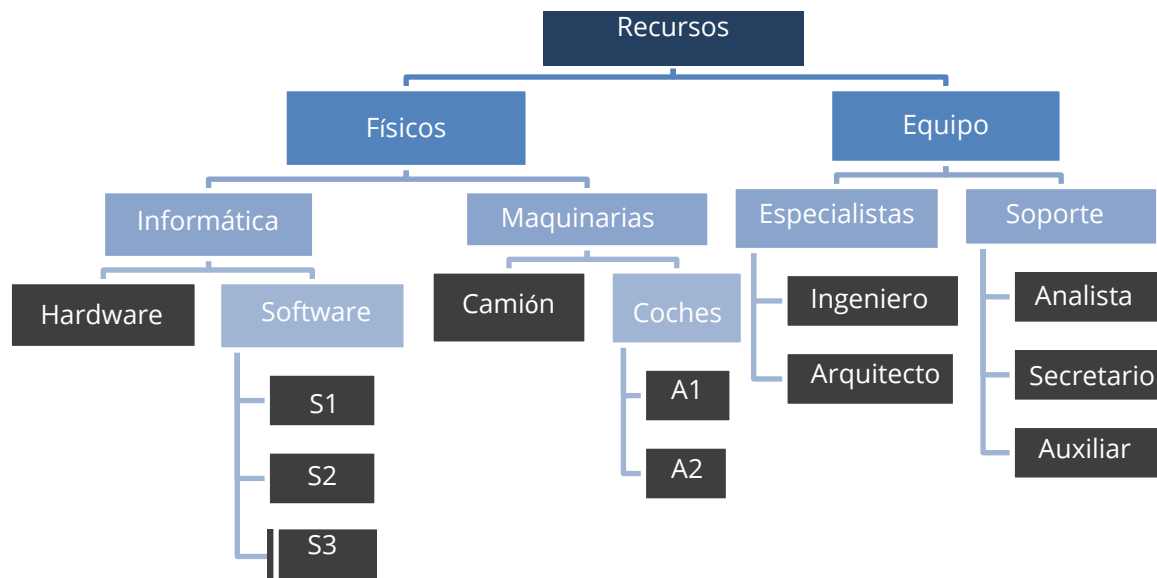

7. PLANIFICAR LA GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN

La planificación de la comunicación se superpone con la identificación, análisis, priorización e involucramiento de los interesados.

La planificación de la comunicación para el proyecto implica considerar lo siguiente:

- ¿Quién necesita la información?
- ¿Qué información necesita cada interesado?
- ¿Por qué se debería compartir la información con los interesados?
- ¿Cuál es la mejor manera de proporcionar información?
- ¿Cuándo y con qué frecuencia se necesita información?
- ¿Quién dispone de la información necesaria?



8. PLANIFICAR LA GESTIÓN DE ADQUISICIONES: RECURSOS FÍSICOS

Recursos físicos se aplica para **cualquier recurso que no sea una persona**: materiales, equipos, software, entornos de prueba, licencias, etc.

La planificación de los recursos físicos implica

- Estimar los recursos necesarios, así como la cadena de suministro, la logística y la gestión.
- La planificación de las **actividades de adquisición** para conseguir los recursos. Esto puede ser tan simple como utilizar un acuerdo de pedido básico o tan complicado como gestionar, coordinar e integrar varias actividades de adquisición de gran envergadura.
- Los equipos de proyecto realizan un análisis de hacer o comprar.



9. PLANIFICAR LA GESTIÓN DE LA CALIDAD

Planificar la gestión de la calidad es identificar y documentar los estándares y métricas para que el proyecto demuestre el cumplimiento con los mismos.

La calidad se planifica, se diseña y se incorpora antes de que comience la ejecución del proyecto.

La prevención de errores y defectos por medio de la implementación de las auditorías de calidad de manera oportuna, periódica y puntual.

Se deben:

- Recomendar mejoras en los procesos y políticas de calidad de la empresa.
- Establecer métricas para medir la calidad.



10. PLANIFICAR LA GESTIÓN DE CAMBIOS


Cambios:

- Cambios como resultado de un evento de riesgo que ocurre o un cambio en el entorno del proyecto,
- Cambios basados en el desarrollo de una comprensión más profunda de los requisitos,
- Cambios debidos a las solicitudes de los clientes.



Los equipos de proyecto deben preparar un proceso para adaptar los planes a lo largo de todo el proyecto.

11. MÉTRICAS

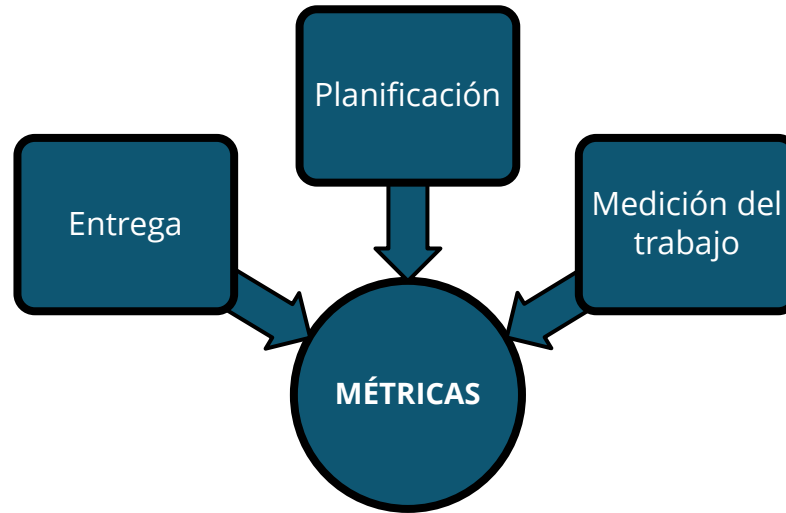

- El establecimiento de métricas incluye establecer los umbrales que indican si el desempeño del trabajo es el esperado, si se aleja positiva o negativamente del desempeño esperado, o si es inaceptable.
- Decidir qué medir y con qué frecuencia se informa de manera óptima con la frase “sólo medir lo que importa”.
 - Las métricas de producto son específicas para los entregables
 - Las métricas asociadas con el cronograma y el desempeño del presupuesto están impulsadas por los estándares organizacionales y están relacionadas con una **línea base** o una versión aprobada del cronograma o presupuesto contra la que se comparan los resultados reales.

