



TEMA 6. RIESGOS Y COMUNICACIONES DEL PROYECTO

Índice

1. Gestión de Riesgos

- 1.1. Qué se entiende por riesgos del proyecto
- 1.2. Plan de gestión de riesgos
- 1.3. Identificar riesgos
- 1.4. Análisis cualitativo de riesgos
- 1.5. Análisis cuantitativo de riesgos
- 1.6. Plan de respuesta ante los riesgos

2. Gestión de las comunicaciones

- 2.1. Pla de gestión de las comunicaciones
- 2.2. Gestionar las comunicaciones

1. GESTIÓN DE RIESGOS

La gestión de riesgos es el proceso **sistemático** de identificar, analizar y responder al riesgo del proyecto.



Muchos directores de proyectos intentan lidiar con los riesgos de manera informal con poca o ninguna planificación previa. Cualquier director de proyectos que opere de esta manera está invitando al fracaso, si no al desastre.

Un plan de riesgo formal e integral del proyecto permite al director del proyecto ser proactivo con respecto a las innumerables cosas que pueden salir mal y salen mal en un proyecto. Sin este plan, se ve obligado a gestionar de forma reactiva cuando las cosas van mal, lo que es fácilmente el enfoque más caro.

En un mundo que cambia realmente rápido, la única estrategia en la que el fracaso está garantizado es no asumir riesgos.
Mark Zuckerberg. Programador, Co-Fundador de Facebook

1. GESTIÓN DE RIESGOS

Proceso formal de identificar y analizar los riesgos, generar respuestas a esos riesgos, y llevar el seguimiento y control de los riesgos de un proyecto.

Los objetivos de la gestión de riesgos son:

- Aumentar la probabilidad y el impacto de los eventos positivos, y
- Disminuir la probabilidad y el impacto de los eventos adversos para el proyecto.



1.1. QUÉ SE ENTIENDE POR RIESGOS DEL PROYECTO

Evento o condición incierta que, si ocurre, tiene un efecto positivo o negativo en, al menos, uno de los objetivos del proyecto.

Riesgo vs Problema

- Existe un problema **hoy**
- Un riesgo es una hipótesis sobre un problema **futuro**



- Gestión de Problemas (Reactivo)
 - Como esquivar el disparo
 - Desviar la bala
 - Reparar los daños
- Gestión de riesgos (Proactivo)
 - Evitar confrontarse con el agresor



1. 1.1. FACTORES DE RIESGO

La gestión de los riesgos implica determinar los siguientes factores para cada riesgo:

- Probabilidad: posibilidad de que ocurra un riesgo (una amenaza o una oportunidad).
- Impacto (consecuencia): efecto que tendrá sobre el proyecto si el riesgo (amenaza u oportunidad) tiene lugar.
- Tiempo de ocurrencia: cuándo puede ocurrir el riesgo (amenaza u oportunidad), durante el ciclo de vida del proyecto.
- Frecuencia: cuántas veces puede ocurrir el riesgo (amenaza u oportunidad).



1.2. PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS

El plan de gestión de los riesgos describe cómo serán estructuradas y realizadas las actividades de gestión de riesgos.

Contenido:

- Metodología que se va a emplear (métodos, herramientas y fuentes de información)
- Roles y Responsabilidades.
- Preparación del presupuesto.
- Periodicidad de ejecución de la gestión de riesgos.
- Categorías de riesgo.
- Definiciones de la probabilidad e impacto de los Riesgos.
- Matriz de Probabilidad e Impacto.
- Revisión de las tolerancias de los interesados.
- Formatos de los Informes.
- Como se hará el seguimiento.

1.2. PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS

Matriz de responsabilidad de riesgos

Matriz de responsabilidades en relación con los distintos procesos del riesgo

	Jefe de proyecto	Equipo	Otros stakeholders	Gestor del riesgo
Planificación gestión	X			
Identificación riesgos	X	X		
Análisis Cualitativo	X	X	X	
Análisis Cuantitativo	X	X	X	
Planificación Respuesta	X	X	X	X
Monitorización y Control	X	X		X

Disparadores

Cuáles son los síntomas o señales de advertencia de que un riesgo ha ocurrido o está a punto de ocurrir.

Los canarios se bajaban a las minas de yacimientos de carbón ya que son mucho más sensibles al grisú y el hecho de que el canario dejara de cantar era indicio de la presencia de grisú.

Tolerancia al riesgo de los interesados según su actitud ante el riesgo

- Aversión al riesgo: Solo toma los riesgos favorables
- Indiferente al riesgo: Solo está influenciado por el impacto esperado
- Propenso al riesgo: Asume el pago de un extra para participar en situaciones de riesgo (amenazas y/o oportunidades)

Umbral de riesgo

Es el nivel de riesgo que es aceptable en la organización.


“Un riesgo que afecte a nuestra reputación no es aceptable” o “un riesgo de sobrepasar el presupuesto en un 5 % es aceptable pero no más”.

1.3. IDENTIFICAR RIESGOS

Identificar los Riesgos es el proceso de determinar los riesgos que pueden afectar al proyecto y documentar sus características.



Causa Política				Causa Económica				Causa Interna (o del Proyecto)				Causa Natural			Causa Financiera		
Gobierno débil	Opinión pública	Cambia legislación	Guerras	Caída de demanda	Competencia	Inflación	Tipo de cambio	Mala Planificación	Falta liderazgo	Falta capacitación	Falta control	Mal clima	Incendio	Terremoto	Falta financiación	Bajo margen	Baja rotación

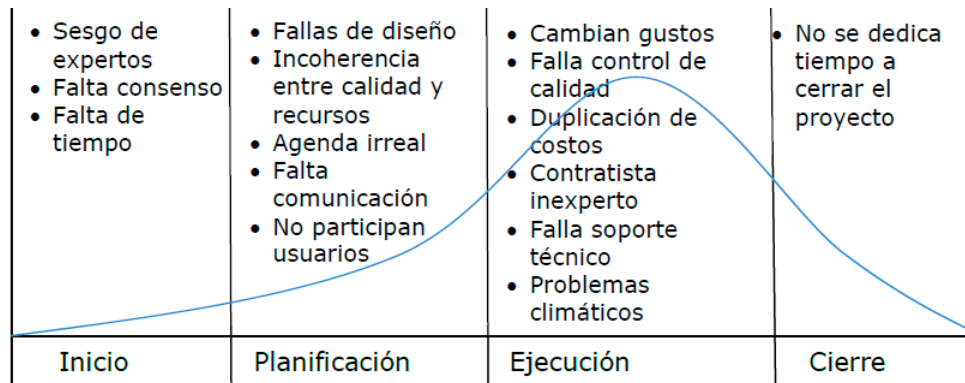

1.3. IDENTIFICAR RIESGOS

Ítem	Concepto
Número identificación del riesgo	Identificarlo de forma inequívoca
Nombre del riesgo	Descriptivo del riesgo
Causa del riesgo	Tipo de fuente de riesgo. Ejemplo: Especificación de requisitos, financieros, etc.
Evento desencadenante	Descripción
Efecto del riesgo	Lista de consecuencias
Disparadores o triggers	Descripción
Riesgo identificado por:	Persona que reconoció al riesgo
Gestor o propietario del riesgo	Persona responsable del riesgo
Gravedad del impacto (efecto)	Cifra
Probabilidad de que suceda	Porcentaje
Periodo previsto de aparición	Fecha/s
Frecuencia	Periodo de tiempo
Índice Inicial de Criticidad (IIC)	Valoración y fecha
Índice Actual de Criticidad (IAC)	Valoración y fecha

1.4. ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS

Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos es el proceso que consiste en priorizar los riesgos para realizar otros análisis o acciones posteriores, evaluando y combinando la probabilidad de ocurrencia y el impacto de dichos riesgos.

Impacto ↑	A	3	6	9
	M	2	4	6
	B	1	2	3
		B	M	A
		Probabilidad →		


El proceso Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos evalúa la prioridad de los riesgos identificados usando la probabilidad relativa de ocurrencia, del impacto correspondiente sobre los objetivos del proyecto si los riesgos llegaran a presentarse, así como de otros factores, tales como el plazo de respuesta y la tolerancia al riesgo por parte de la organización, asociados con las restricciones del proyecto en términos de costo, cronograma, alcance y calidad.

1.4. ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS

Matriz probabilidad impacto

Impacto \ Probabilidad	Muy bajo 1	Bajo 2	Moderado 3	Alto 5	Muy alto 10
Muy baja 1	1	2	3	5	10
Baja 2	2	4	6	10	20
Moderada 3	3	6	9	15	30
Alta 4	4	8	12	20	40
Muy alta 5	5	10	16	25	50

Proximidad, urgencia e inactividad del riesgo

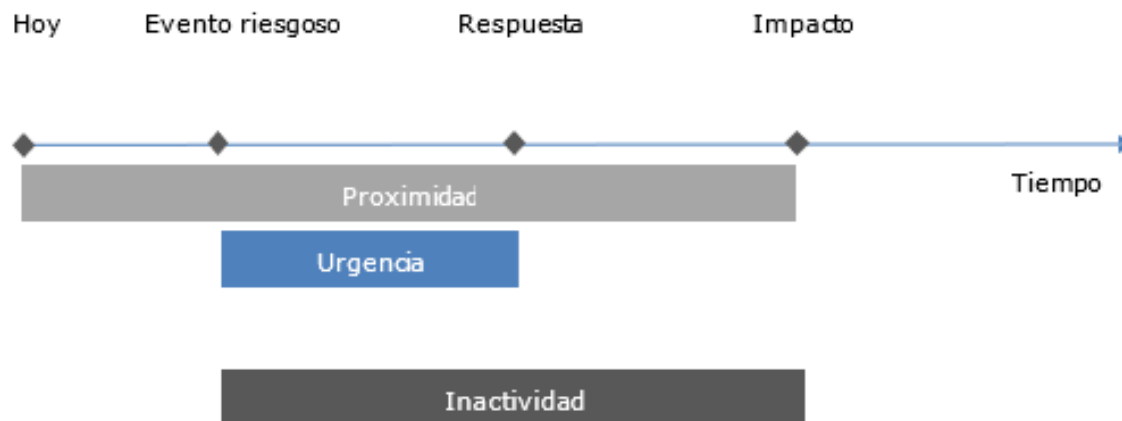

1.5. ANÁLISIS CUANTITATIVO DE RIESGOS

Realizar el Análisis Cuantitativo de Riesgos es el proceso de analizar numéricamente el efecto de los riesgos identificados sobre los objetivos generales del proyecto.


El proceso Realizar el Análisis Cuantitativo de Riesgos analiza el efecto de dichos riesgos sobre los objetivos del proyecto. Se utiliza fundamentalmente para evaluar el efecto acumulativo de todos los riesgos que afectan el proyecto. Cuando los riesgos guían el análisis cuantitativo, el proceso se puede utilizar para asignar a esos riesgos una prioridad numérica individual.



1.6. PLANIFICAR LA RESPUESTA A LOS RIESGOS

Planificar la Respuesta a los Riesgos es el proceso de desarrollar opciones y acciones para mejorar las oportunidades y reducir las amenazas a los objetivos del proyecto.

El proceso Planificar la Respuesta a los Riesgos se realiza después del proceso Realizar el Análisis Cuantitativo de Riesgos (en caso de que se utilice). Cada respuesta a un riesgo requiere una comprensión del mecanismo por el cual se abordará el riesgo. Este es el mecanismo utilizado para analizar si el plan de respuesta a los riesgos está teniendo el efecto deseado.



1.6.1. ESTRATEGIAS PARA PLANIFICAR LA RESPUESTA A LOS RIESGOS

Riesgos (-) / Amenazas			Riesgos (+) / Oportunidades		
Estrategia	Probabilidad	Impacto	Estrategia	Probabilidad	Impacto
Escalar	=	=	Escalar	=	=
Evitar	0%	=	Explotar	100%	=
Transferir	=	↓	Compartir	↑	↓
Mitigar	↓	↓	Mejorar	↑	↑
Aceptar	=	=	Aceptar	=	=

1.6.1. ESTRATEGIAS PARA PLANIFICAR LA RESPUESTA A LOS RIESGOS

Impacto \ Probabilidad	Muy bajo 1	Bajo 2	Moderado 3	Alto 5	Muy alto 10
Muy baja 1	Aceptar	Aceptar	Aceptar	Aceptar	Transferir o Mitigar
Baja 2	Aceptar	Aceptar	Aceptar	Transferir o Mitigar	Evitar
Moderada 3	Aceptar	Aceptar	Aceptar	Transferir o Mitigar	Evitar
Alta 4	Aceptar	Aceptar	Transferir o Mitigar	Evitar	Evitar
Muy alta 5	Aceptar	Transferir o Mitigar	Transferir o Mitigar	Evitar	Evitar


2. COMUNICACIONES

La Gestión de las Comunicaciones del proyecto incluye todos los procesos requeridos para asegurar la apropiada y oportuna generación, recolección, distribución, almacenamiento, recuperación, y destino final de la *INFORMACIÓN DEL PROYECTO*.



2.1. PLANIFICAR LA GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES

Planificar la Gestión de las Comunicaciones es el proceso de desarrollar un enfoque y un plan adecuados para las comunicaciones del proyecto sobre la base de las necesidades y los requisitos de información de los interesados y de los activos de la organización disponibles.

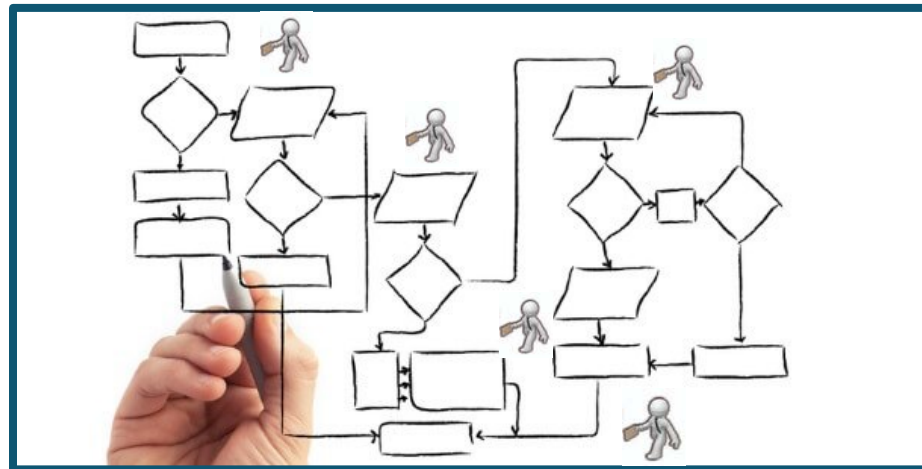



2.1. PLANIFICAR LA GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES

Planificar la Gestión de las Comunicaciones implica responder a:

- ¿Qué información necesita cada grupo de interesados?
- ¿Quién recibirá la información?
- ¿Cuántos canales hay involucrados?
- ¿Quién se comunicará con quién?
- ¿Cuándo y con qué frecuencia necesitarán la información?
- ¿Cómo se distribuirá la información?
- ¿Quién distribuirá la información?
- ¿Qué tecnología utilizaremos según las necesidades de información y los recursos disponibles?
- ¿Cómo vamos a almacenar, recuperar y poner a disposición la información?



2.1. PLANIFICAR LA GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES

Planificar la Gestión de las Comunicaciones implica determinar

- Canales de comunicación
- Tecnología de las comunicaciones
- Modelo de comunicación
- Métodos de comunicación
- Dimensiones de la comunicación
- Enfoques de la comunicación



2.1. PLANIFICAR LA GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES

El plan de gestión de las comunicaciones es un componente del plan para la dirección del proyecto y describe la forma en que se planificarán, estructurarán, monitorearán y controlarán las comunicaciones del proyecto.

El plan contiene la siguiente información:

- Requisitos de comunicación de los interesados
- Formato y contenidos del tipo de información
- Canales de comunicación
- Personas responsables de comunicar
- Responsable de autorizar información confidencial
- Personas que recibirán la información
- Tecnología de las comunicaciones a utilizar
- Frecuencia de las comunicaciones
- Proceso para escalar las comunicaciones
- Glosario de términos comunes
- Proceso para actualizar las comunicaciones

2.1. PLANIFICAR LA GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES

MATRIZ DE LAS COMUNICACIONES

ID #	Entregable	Frecuencia del informe	Medio	Responsabilidad del Interesado				
				Int. 1	Int. 2	Int. 3	...	Int. n
1	a	M	R	D	E	A	...	V
2	b	S	I	S	D	D	...	A
3	c	Q	M	E	D	D	...	S
....	...	...	...	...	...	...	...	...
n	n	E	P	D	D	A	...	E

Notas

Frecuencia: M (mensual); S (semanal); Q (quincenal); E (eventual)


Medio: I (informe); M (minuta); E (e-mail); R (reunión); G (gráfico); P (planilla)

Responsabilidad: D (destinatario); E (emisor); A (autoriza); S (soporte); V (valida)

2.2. GESTIONAR LAS COMUNICACIONES

Gestionar las Comunicaciones es el proceso de crear, recopilar, distribuir, almacenar, recuperar, y realizar la disposición final de la información del proyecto de acuerdo con el plan de gestión de las comunicaciones.

El beneficio clave de este proceso es que permite un flujo de comunicaciones eficaz y eficiente entre los interesados del proyecto.

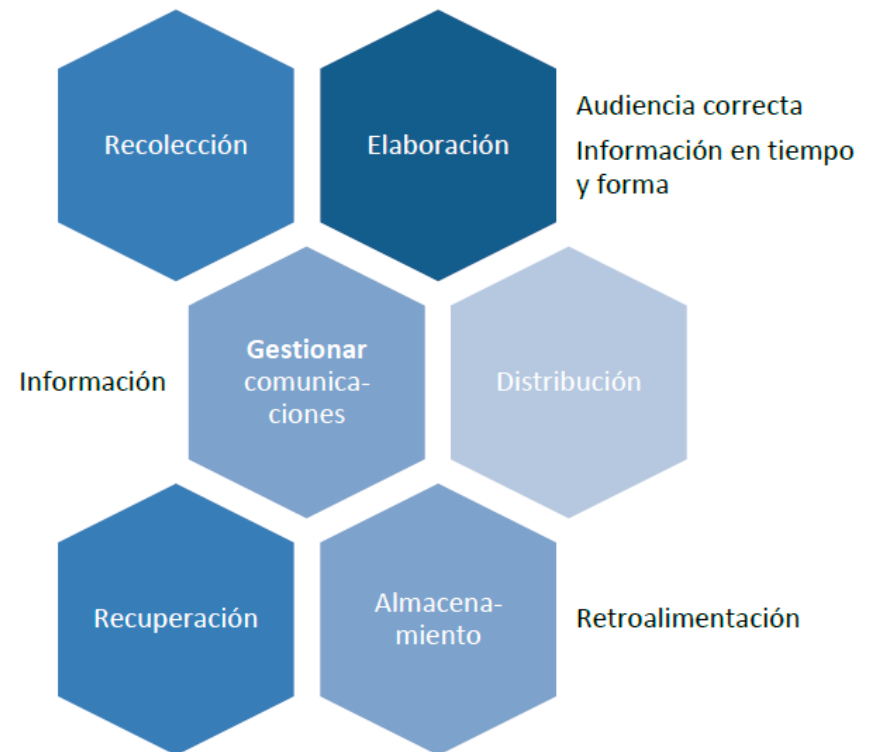



2.2.1. HABILIDADES DE COMUNICACIÓN

Habilidades de comunicación:


- Modelos Emisor-Receptor. Incorporar ciclos de retroalimentación para proporcionar oportunidades de interacción/participación y eliminar barreras de comunicación.
- Elección del Medio. Descripción precisa de las situaciones en la que es preferible una comunicación escrita u oral, cuándo escribir un memorando informal o un informe formal, y cuándo comunicarse cara a cara o por correo electrónico.
- Estilo de Redacción. Uso apropiado de la voz activa frente a la voz pasiva, estructura de las oraciones y selección de palabras.
- Técnicas de Gestión de Reuniones. Preparar una agenda y abordar los conflictos.
- Técnicas de Presentación. Conciencia del impacto del lenguaje corporal y el diseño de ayudas visuales.
- Técnicas de Escucha. Escucha activa (captar, aclarar y confirmar comprensión) y eliminación de barreras que afectan negativamente a la comprensión.



2.2.1.1. TÉCNICAS DE GESTIÓN DE E-MAILS

Normas para envío de emails

- Pensar muy bien a quiénes debo poner en copia. Más de tres personas podría ser un exceso.
- No responder los emails con copia a todos.
- No enviar un email que ya tenga más de dos ciclos envío-recepción. En su lugar, redactar un resumen ejecutivo de lo que queremos comunicar.
- No enviar adjuntos innecesarios.
- No escribir un mail que tenga más de 20 renglones. Para asuntos largos escribir en el procesador de textos y enviar como adjunto.
- Respetar el asunto. Si va a reutilizar el email que mandó otra persona, cambie el título del asunto acorde a los nuevos contenidos.
- Reservar el signo “!” para asuntos realmente urgentes o prioritarios.



2.2.1.2. TÉCNICAS DE GESTIÓN DE REUNIONES

Recomendaciones para reuniones efectivas:

- Preparar y distribuir la agenda con anticipación
- Asegurar que asistan los participantes apropiados
- Establecer horario de inicio-fin y RESPETARLO
- No desviarse de los temas de la agenda
- Publicar orden del día de la reunión con acciones y responsables

