



TEMA 8.

Ejecución de trabajos

Índice

1. Procesos de ejecución de gestión de equipos

1.1. Adquirir recursos

1.2. Desarrollar el equipo

1.3. Dirigir el equipo del proyecto

2. Ejecución de las adquisiciones

1. PROCESOS DE EJECUCIÓN DE GESTIÓN DE EQUIPOS

Las herramientas y técnicas de gestión de proyectos para planificar, programar y controlar el trabajo son una condición necesaria pero no suficiente para el éxito de los proyectos

Los equipos no surgen de la nada, ¡hay que construirlos!





1.1. ADQUIRIR LOS RECURSOS DE LAS ACTIVIDADES

Adquirir Recursos es el proceso de obtener miembros del equipo necesarios para completar el trabajo del proyecto.

El beneficio clave de este proceso es que describe y guía la selección de recursos y los asigna a sus respectivas actividades.

Este proceso se lleva a cabo periódicamente a lo largo del proyecto, según sea necesario

Los siguientes son algunos de los criterios por los cuales se deben seleccionar los miembros del equipo:

- El candidato posee las habilidades necesarias para realizar el trabajo requerido a la velocidad necesaria para cumplir con los plazos.
- Las necesidades del candidato serán satisfechas a través de la participación en el proyecto
- El candidato tiene el temperamento para encajar con otros miembros del equipo que ya han sido reclutados y con el gerente del proyecto y otros jugadores clave.

1.1. ADQUIRIR LOS RECURSOS DE LAS ACTIVIDADES

Decisiones multi-criterio

Criterio	Peso	Recurso A	Recurso B	Recurso C
Disponibilidad	50%	2	1	3
Costo	30%	2	2	1
Idiomas	15%	1	3	1
Referencias	5%	2	3	1
Calificación		1,85	1,7	2

Notas: 1 (malo), 2 (regular), 3 (bueno)

Negociación: negociar los mejores recursos con los gerentes funcionales, otros directores de proyectos, proveedores, etc

Asignación previa: considerar para la ejecución de actividades los recursos que ya fueron asignados al proyecto.

Equipos virtuales: trabajar con equipos que no están localizados en el mismo lugar físico.

Ventajas	Desventajas
• Acceder a expertos de diferentes regiones • Ahorro en gastos de oficina • Flexibilidad de horarios y días de trabajo • Acceso a personal discapacitado que no puede trasladarse • Ahorro en gastos de traslados (tiempo y dinero) • Proximidad a interesados claves (cliente, proveedor, usuario, etc.)	• Comunicaciones complejas por la falta de reuniones cara a cara • Aislamiento de la persona, lo que dificulta el desarrollo de su inteligencia emocional interpersonal • Dependencia de Internet




1.2. DESARROLLAR EL EQUIPO DEL PROYECTO

Desarrollar el Equipo del Proyecto es el proceso de mejorar las competencias, la interacción de los miembros del equipo y el ambiente general del equipo para lograr un mejor desempeño del proyecto.

El beneficio clave de este proceso es que produce como resultado una mejora del trabajo en equipo, mejoras de las habilidades interpersonales y competencias, empleados motivados, reducción de la deserción y mejora el desempeño del proyecto en general. Este proceso se lleva a cabo a lo largo de todo el proyecto.

1.3. DESARROLLAR EL EQUIPO DEL PROYECTO


- **Motivación**




- **Reconocimientos y recompensas:** utilizar un sistema de incentivos para premiar comportamiento
- **Capacitación:** actividades de formación para mejorar las competencias individuales y del trabajo en equipo.
- **Evaluaciones individuales y del equipo**

1.2. DESARROLLAR EL EQUIPO DEL PROYECTO

Etapas en el desarrollo de un equipo: **Escalera de Tuckman**

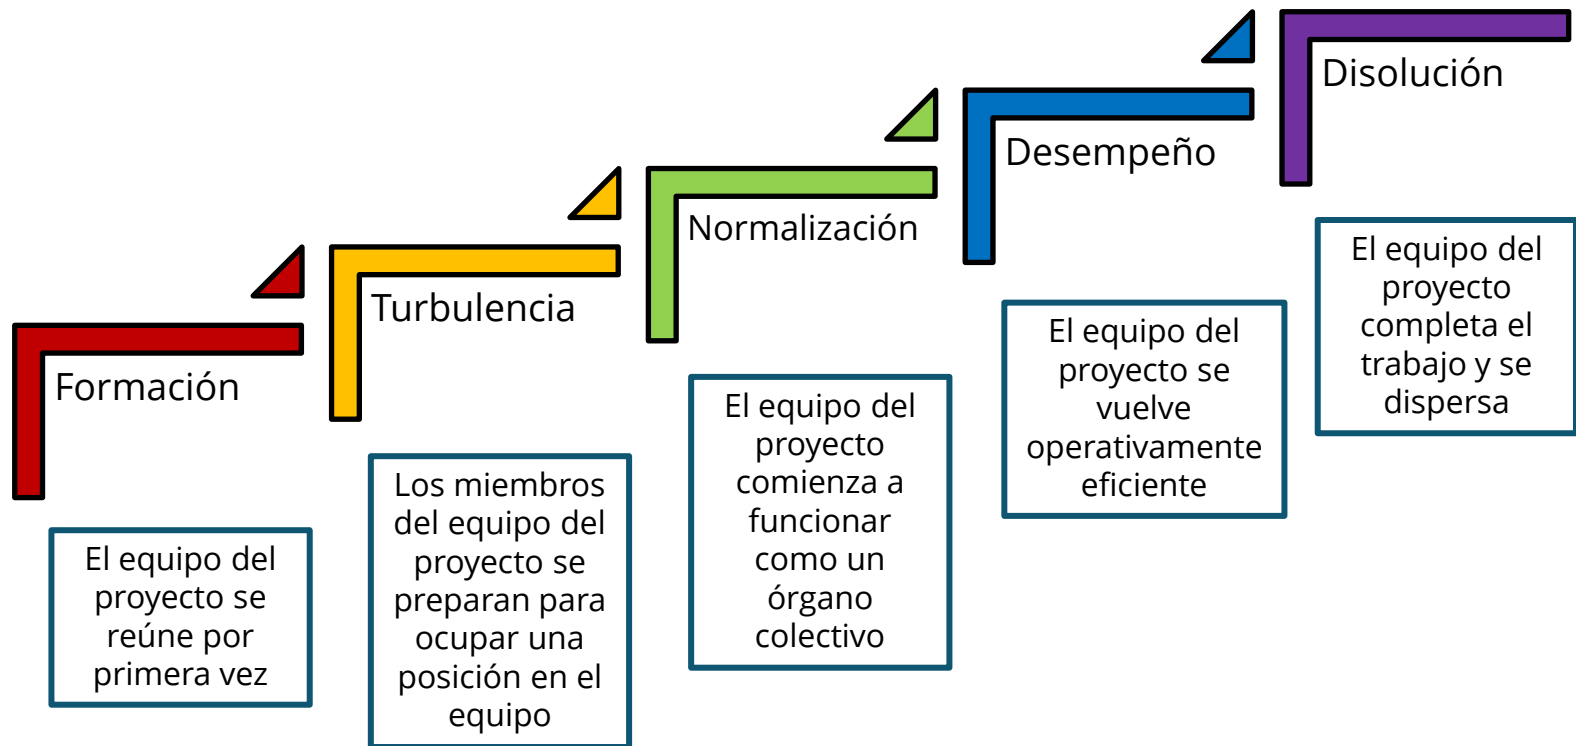



1.2. DESARROLLAR EL EQUIPO DEL PROYECTO

Desarrollar el compromiso con un equipo

- Haga que los miembros del equipo interactúen con frecuencia para que adquieran un sentido de equipo.
- Asegúrese de que las necesidades individuales se satisfagan mediante la participación en el equipo.
- Hágales saber a todos los miembros por qué el proyecto es importante. A la gente no le gusta trabajar en un "perdedor".
- Asegúrate de que todos los miembros compartan los objetivos del equipo. Una manzana podrida puede estropear el barril.
- Mantén la competencia dentro del equipo al mínimo. La competencia y la cooperación son opuestas. Deja que los miembros compitan con personas ajenas al equipo, no dentro de él.



1.3. DIRIGIR AL EQUIPO DEL PROYECTO

Dirigir al Equipo es el proceso que consiste en hacer seguimiento del desempeño de los miembros del equipo, proporcionar retroalimentación, resolver problemas y gestionar cambios en el equipo a fin de optimizar el desempeño del proyecto.

El beneficio clave de este proceso es que influye en el comportamiento del equipo, gestiona los conflictos y resuelve los problemas.

Este proceso se lleva a cabo a lo largo de todo el proyecto.



1.3. DIRIGIR AL EQUIPO DEL PROYECTO

Resolución de conflictos

- A. Evitar / Retirarse: retirarse del conflicto o postergarlo hasta estar mejor preparado o hasta que lo resuelvan otros.
- B. Suavizar / Acomodar: resaltar los puntos de común acuerdo en lugar de las diferencias. Hacer concesiones para mantener la armonía del grupo.
- C. Compromiso / Conciliación: cada parte debe ceder algo.
- D. Forzar / Dirigir: imponer una posición sobre las otras.
- E. Colaborar: incorporar múltiples perspectivas a través de la cooperación y el diálogo abierto para buscar compromiso y consenso.



2. EFECTUAR LAS ADQUISICIONES

Efectuar las Adquisiciones es el proceso de obtener respuestas de los vendedores, seleccionarlos y adjudicarles un contrato. A lo largo del proceso Efectuar las Adquisiciones, **el equipo recibirá ofertas y propuestas, y aplicará criterios de selección definidos previamente para seleccionar uno o más vendedores que estén calificados para efectuar el trabajo y que sean aceptables como tales.**

En el caso de adquisiciones importantes, es posible reiterar el proceso general de solicitar respuestas de vendedores y evaluar dichas respuestas. Se puede elaborar una lista restringida de vendedores calificados basándose en una propuesta preliminar. Puede realizarse entonces una evaluación más detallada, fundada en un documento de requisitos más específico e integral, solicitado a los vendedores que integran la lista restringida. Además, las herramientas y técnicas aquí descritas pueden utilizarse solas o combinadas de cara a seleccionar vendedores. Por ejemplo, se puede utilizar un sistema de ponderación para:

- Seleccionar un único vendedor al que se le solicitará la firma de un contrato estándar.
- Establecer una secuencia de negociación mediante la clasificación de todas las propuestas según puntuaciones ponderadas asignadas a cada una de ellas.



2. EFECTUAR LAS ADQUISICIONES

Hacer o comprar

Producción propia	Comprar
▪ Falta de calidad o confiabilidad en los proveedores ▪ Know-how o experiencia para la producción del insumo ▪ Mantener el control sobre el proceso productivo ▪ Evitar acceso a información confidencial a competidores ▪ Falta de proveedores alternativos si el vendedor no cumple	▪ Falta de recursos disponibles para la producción propia ▪ No ampliar plantilla del equipo ▪ Acceso a auditores externos objetivos ▪ Especialización y economías de escala del proveedor ▪ El vendedor es propietario de las licencias



2. EFECTUAR LAS ADQUISICIONES

Statement of Work (SOW) es una descripción del ítem a subcontratar en un grado de detalle que permita a los vendedores prospectos determinar si tienen la capacidad de proveerlos :

- SOW (Statement of Work) para productos o servicios claramente especificados.
- SOO (Statement of Objectives) para ítems presentados como problema a ser resuelto.

Deben ser claros, completos y concisos. Deben incluir servicios colaterales como soporte operacional post-proyecto.

2. EFECTUAR LAS ADQUISICIONES

Tipos de contratos

Contrato		Siglas	Ejemplo
Precio fijo	Cerrado	FFP	Comprar hierro por 150 € / kg
	+ Incentivo	FPIF	Pagar 10.000€ por el estudio de mercado más 100€ por cada día de adelanto en la entrega en relación a la línea base.
	+ Ajuste	FPEPA	Pagar 2 millones de € por el edificio llave en mano más un ajuste inflacionario según el índice de precios de la construcción.
Reembolso	+ Honorario	CPFF	Reintegrar todos los gastos de una obra al contratista más un honorario de 3.000€ por cada semana de trabajo.
	+ Incentivo	CPIF	Reintegrar todos los gastos de la construcción de una carretera, más un adicional del 50% sobre el ahorro de costos que consiga el contratista en relación a la línea base. El incentivo se basa en criterios objetivos (ahorro de costos, entrega temprana, etc.)
	+ Premio	CPAF	Reintegrar todas las horas de trabajo invertidas para el desarrollo de un software más un premio de 1000 € en caso que el entregable final satisfaga las expectativas del cliente. El premio se basa en criterios subjetivos y no podrá tener reclamos legales por parte del vendedor.
Tiempo y materiales		T&M	Pagar 1000€ por metro de perforación para un pozo de agua. Al desconocer la profundidad a la que se podría encontrar agua en las napas subterráneas, el precio final a pagar dependerá de los metros perforados.

2. EFECTUAR LAS ADQUISICIONES


Ventajas e inconvenientes

Llave en mano	Administración de materiales
+ Pocos contratos + Poca carga administrativa + Responsabilidad sobre un contratista - Mayor costo - Menor control	- Muchos contratos - Mayor carga administrativa - Responsabilidad compartida sobre varios contratistas + Menor costo + Mayor control
Precio Fijo	Costos reembolsables
+ Menor riesgo para comprador - Necesita información completa del proyecto	- Mayor riesgo para comprador + Se puede contratar con información incompleta
Pago al final contra entrega	Pago con anticipos
+ Mayor compromiso del vendedor + Menor riesgo para el comprador	- Menor compromiso del vendedor - Mayor riesgo para el comprador

2. EFECTUAR LAS ADQUISICIONES

INFORMACIÓN DEL ALCANCE DEL TRABAJO	POCA INFORMACIÓN	INFORMACIÓN PARCIAL	INFORMACIÓN COMPLETA		
INCERTIDUMBRE	NIVEL ALTO	NIVEL MODERADO	NIVEL MÍNIMO		
NIVEL DE RIESGO	NIVEL ALTO	NIVEL MEDIO	NIVEL BAJO		
DISTRIBUCIÓN DEL RIESGO					
TIPOS DE CONTRATO	COST PLUS PERCENTAGE FEE (CPPF)	COST PLUS INCENTIVE FEE (CPIF)	COST PLUS FIXED FEE (CPFF)	FIXED PRICE PLUS INCENTIVE (FPPI)	FIRM FIXED PRICE (FFP)

2. EFECTUAR LAS ADQUISICIONES

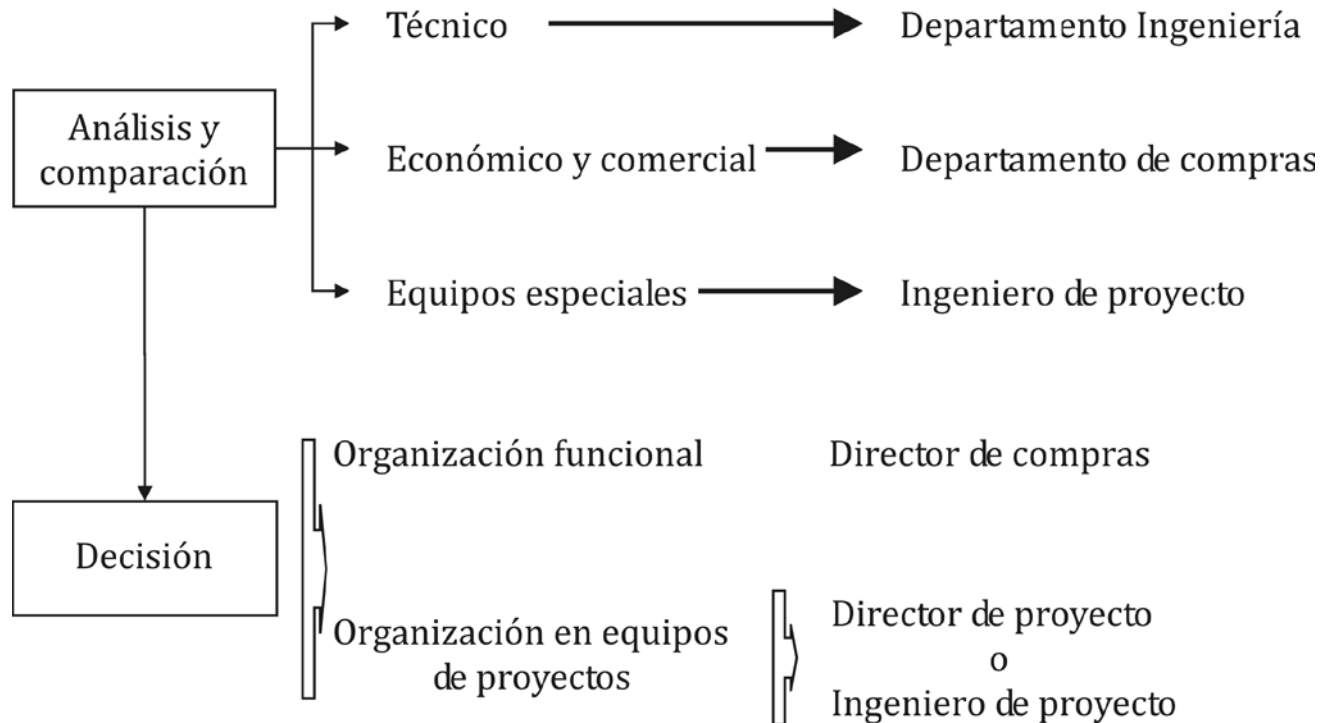



PUNTOS CLAVE PARA RECORDAR

- Los equipos no surgen de la nada, ¡hay que construirlos!
- Hacer que todo el equipo participe en la planificación es una forma de iniciar el proceso de creación de equipos.
- Tratar con metas, roles y responsabilidades, procedimientos y relaciones, en ese orden.
- Los llamados conflictos de personalidad suelen estar causados por las escasas habilidades interpersonales de los miembros del equipo. Para que los equipos funcionen bien, todos los miembros deben recibir capacitación en esta área.
- El estilo de liderazgo apropiado para un equipo depende de su etapa de desarrollo. En la etapa de formación, es directiva. En las tormentas, está influyendo. En la etapa de normalización, cambie a un estilo participativo. Finalmente, cuando el equipo llega a la etapa de ejecución, puede ser delegativo.

